



#### **GESTIÓN TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA**

> Aprobación del Reglamento de la





▶Procesamiento de denuncias por comisión de posibles hechos corrupción.

la de

▶ Procesamiento de denuncias negación injustificada de Acceso a la Información.





## **GESTIÓN TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA**

Capacitación al Control Social en 8 Departamentos





Inspección a Proyectos Carreteros













## ACCIONES A CORTO PLAZO GESTIÓN 2018



Concluir la construcción y/o reconstrucción de 735,44 kilómetros de carreteras y dobles vías; y de 3,32 kilómetros de puente, totalizando 738,76 nuevos kilómetros; para la consolidación y desarrollo de la RVF a nivel nacional en la Gestión 2018.



Realizar trabajos de construcción en 3.237,62 kilómetros de carreteras y dobles vías; y de 4,80 kilómetros de puentes en construcción a nivel nacional en la Gestión 2018.

Realizar trabajos de diseño de construcción de carretera, doble vías y puentes en 1.040,16 Km de la RVF en la Gestión 2018.



## ACCIONES A CORTO PLAZO GESTIÓN 2018

Realizar trabajos de rehabilitación en 1.121,42 kilómetros de carreteras a nivel nacional en la Gestión 2018.

Realizar obras de mejoramiento en 11.740,78 km de carreteras a nivel nacional durante la gestión 2018.

Realizar la gestión ambiental a la ejecución de proyectos viales liberando el derecho de vía de 2.507,79 Km. para la prevención, mitigación y reposición ambiental en el marco de la responsabilidad social y ambiental en la RVF durante la gestión 2018.







## INDICADORES ESTABLECIDOS Y RESULTADOS ALCANZADOS GESTIÓN 2018


INDICADORES	RESULTADO ESPERADO EN KM	RESULTADO ALCANZADOS EN KM	%
Kilómetros <u>construidos</u> y/o reconstruidos de carreteras y dobles vías	735,44	592,34	80,54
Kilómetros <u>construidos</u> de puentes	3,32	1,12	33,73
Kilómetros <u>en construcción</u> de carreteras y dobles vías	3.237,62	2.738,00	84,57
Kilómetros de túneles y puentes <u>en</u> <u>construcción</u>	4,8	2,21	46,04
Kilómetros en rehabilitación	1.121,42	880,11	78,48
Kilómetros en conservación vial con empresas y/o microempresas	11.740,78	11.548,50	98,36
Kilómetros en proceso de LDDV o liberados	2.507,79	2.351,14	93,75
Kilómetros en diseño y/o diseñadas para construcción y rehabilitación	1.040,16	1.033,38	99,35










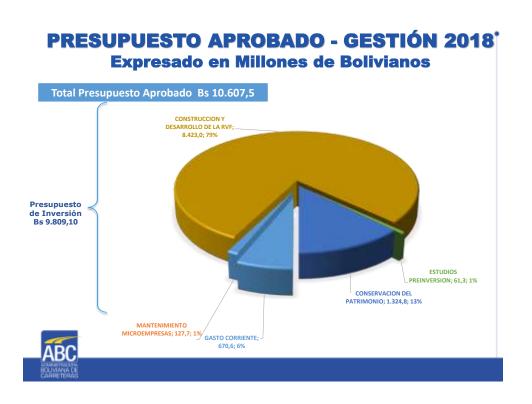

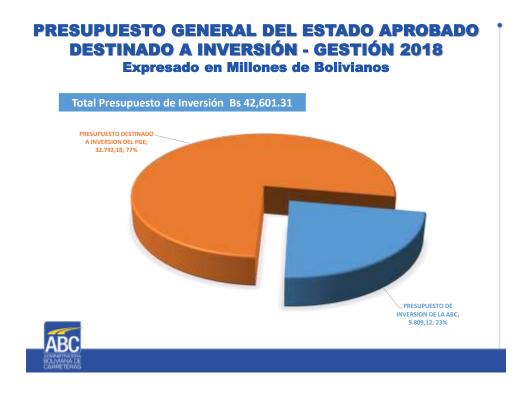




#### **APROBACIÓN DE NORMATIVA**

- DECRETO SUPREMO No 3606 del 27 de Junio de 2018 -Crea un Fondo Rotatorio, a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC.
- DECRETO SUPREMO No 3750 del 19 de Diciembre de 2018 - Autoriza a la Administradora Boliviana de Carreteras la atención, de manera pronta y oportuna, de eventos o contingencias que puedan perjudicar la libre transitabilidad en la Red Vial Fundamental.



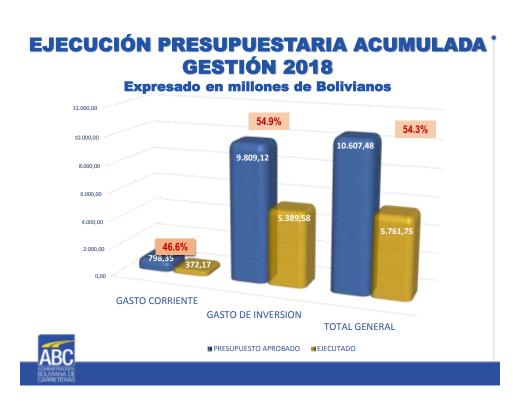









#### PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE LA PAZ






















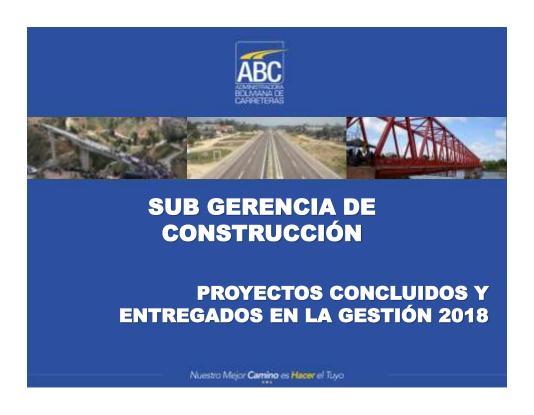



















## PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN VIAL INICIADOS EN LA GESTIÓN 2018



	N°	DEPTO.	NOMBRE DEL PROYECTO	LONG.	ORDEN DE PROCEDER
	4	СОСНАВАМВА	CONSTRUCCION DE LA DOBLE VIA PUENTE CHIMORE - VILLA TUNARI, TRAMOS: FIN PUENTE CHIMORE - PROG. 301+000 Y PROG. 301+000 - PROG. 315+300 VILLA TUNARI - (TRAMO I: FIN PUENTE CHIMORE - PROG. 301+000)	17,46 KM	05/02/2018
	5	СОСНАВАМВА	CONSTRUCCION DE LA DOBLE VIA PUENTE CHIMORE- VILLA TUNARI, TRAMOS: FIN PUENTE CHIMORE - PROG. 301+000 Y PROG. 301+000 - PROG. 315+300 VILLA TUNARI (TRAMO II:PROG. 301+000 - PROG. 315+300 VILLA TUNARI	14,30 KM	05/02/2018
3C	6	SANTA CRUZ	PUENTE EL TORNO - ESPEJOS	230 M	21/05/2018



#### PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VIAL 2018

**OBJETIVO DEL PROGRAMA.-** Establecer continuidad en el mantenimiento y conservación de las carreteras de la RVF del país.

	OS DE CONSER\ OS EN LA GESTIO	PROYECTOS DE CONSERVACION VIAL FINALIZADOS EN LA GESTION 2018			
	CANTIDAD	DE PROYECTOS	CANTIDAD DE PROYECTOS		
DEPARTAMENTO	MANTENIMIENTO DE VIAL EMERGENCIA		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA	
LA PAZ	18	5	17	5	
ORURO	6	0	6	0	
POTOSI	9	4	9	4	
СОСНАВАМВА	6	0	6	0	
CHUQUISACA	3	1	3	1	
TARIJA	5	0	5	0	
SANTA CRUZ	14	2	12	2	
BENI	4	2	4	4	
PANDO	3	0	3	0	
SUMA	SUMA 68 14		65	14	

RESULTADO

PROYECTADO

82 PROYECTOS
de Mantenimiento y
Emergencias iniciados en
la gestión 2018

79 PROYECTOS de Mantenimiento y

Emergencias concluidos en la gestión 2018 (incluye proyectos iniciados en la gestión 2017)



### PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VIAL 2018

#### MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL (PROVIAL)

#### CONTRATOS DE MICROEMPRESAS (PROVIAL) GESTION 2018

DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE CONTRATOS	AVANCE FISICO %
LA PAZ	91	
ORURO	39	
POTOSI	51	
COCHABAMBA	38	
CHUQUISACA	17	100,00%
TARIJA	36	
SANTA CRUZ	103	
BENI	32	
PANDO	16	
TOTAL	423	

COMPONENTES.-✓ Bacheo.

✓Limpieza de la Vía.


✓ Barreras metálicas. ✓ Señalización Horizontal. ✓ Señalización Vertical.

LAS ACTIVIDADES DE LAS MICROEMPRESAS, SON CONTINUAS DURANTE EL AÑO, PROGRAMADAS Y EVALUADAS CADA 15 DIAS.







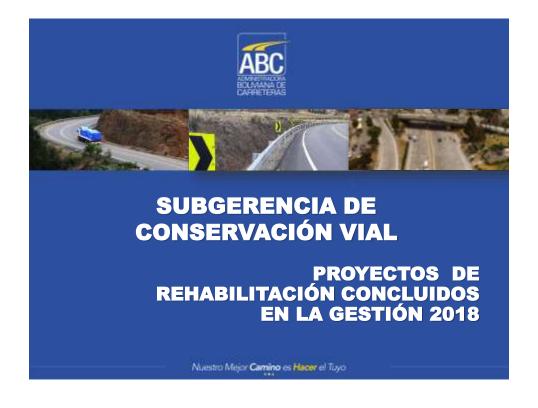





#### OBRAS DE REHABILITACION AUTOPISTA LA PAZ - EL ALTO



	LONGITUD	DEPARTAMENTO	FECHA CONCLUSIÓN DE OBRAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
RC:	10,46 km	LA PAZ	30/12/18	98,75 %	83,87%
STANDONA STANDATO					









# PROYECTOS DE REHABILITACIÓN EN EJECUCIÓN



PROYECTO	LONGITUD	DEPARTAMENTO	FECHA CONCLUSIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
TRAMO CARRETERO EPIZANA – COMARAPA TRAMO I: EPIZANA – PUENTE VALLE HERMOSO	58,277 km	СОСНАВАМВА	30/06/2019	50,48%	56,44%
TRAMO CARRETERO EPIZANA – COMARAPA TRAMO III: PUENTE VALLE HERMOSO – LA SIBERIA	27,10 km	СОСНАВАМВА	16/12/2017	100,00%	99,96%
TRAMO CARRETERO EPIZANA – COMARAPA TRAMO IV: LA SIBERIA - COMARAPA	42,60 km	SANTA CRUZ	06/04/2019	90,11%	91,80%




# PROYECTOS EN ETAPA DE MANTENIMIENTO POR ESTANDARES REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES






PROYECTO	LONGITUD	DEPARTAMENTO	FECHA CONCLUSIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN	FECHA CONCLUSIÓN DE MANTENIMIENTO POR ESTANDARES	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
CARRETERA SAN RAMON-RIO URUGUAITO TRAMO I: SAN RAMON - KM 20 (CONCEPCIÓN)	63,53 km	SANTA CRUZ	29/06/2017	30/11/2019	98,22%	98,22%
CARRETERA SAN RAMON-RIO URUGUAITO TRAMO II: TRAMO II: KM 20 (CONCEPCION)-RIO URUGUAITO	63,53 km	SANTA CRUZ	29/06/2017	30/11/2019	98,07%	98,97%



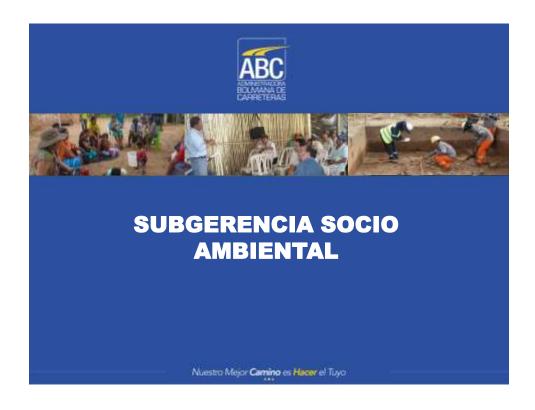



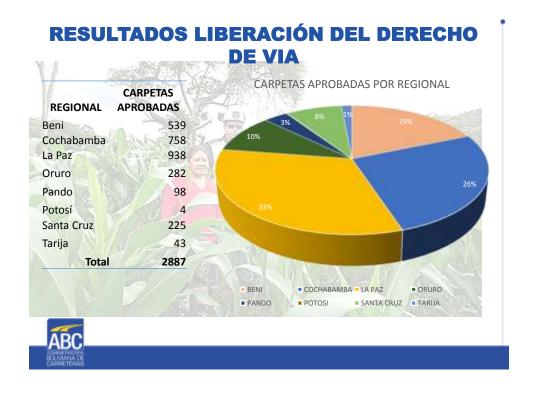





#### RESULTADOS DE LA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

La Subgerencia Socio Ambiental monitorea la implementación de programas y proyectos de carácter social, ambiental y cultural, en consenso con gobiernos municipales, comunidades y organizaciones indígenas, originarias y campesinas. En este ámbito desarrollaron los siguientes componentes y proyectos.



Reposición de capilla (PADILLA – EL SALTO)



Implementación del Hato Ganadero (TUNEL INCAHUASI)

# ABC

#### **RESULTADOS DE LA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL**



social (TÚNEL – INCAHUASI)



Señalización turística (SAN IGNACIO - PUERTO GANADERO)



Rescate arqueológico (SANTA CRUZ - WARNES)



SAN BORJA - SAN IGNACIO DE MOXOS



Colocado de basureros e integración paisajística (MONTEAGUDO - MUYUPAMPA)



(SANTA CRUZ - WARNES)



