



ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

AJUSTE PRESUPUESTARIO 2021 -2022

PLAN DE PUEBLO INDÍGENA (PPI) PUEBLO INDÍGENA TACANA

PROYECTO DE CARRETERAS NACIONALES E INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA
CRÉDITO 4923-BO

ORGANISMO FINANCIADOR:
BANCO MUNDIAL
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF)

Diciembre, 2021

La Paz - Bolivia

INDICE

GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	4
INDICE DE CUADROS	5
INTRODUCCION	6
ANTECEDENTES	6
CAPITULO I. BREVE CARACTERIZACION DEL PUEBLO TACANA.....	8
1.1 DATOS GENERALES	8
1.2 SITUACIONES QUE DETERMINAN EL AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DEL PPI.....	10
CAPITULO II. ACCIONES ESTRATEGICAS Y AVANCES ALCANZADOS	12
2.1 OBJETIVOS	12
2.1.1 Objetivo General	12
2.1.2 Objetivos específicos	12
2.2 COMPONENTES	12
2.3 AVANCES EN LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA.....	13
CAPITULO III COMPLEMENTACIONES Y CAMBIOS AL PPI TACANA AL 2021	15
3.1. JUSTIFICACION DE COMPLEMENTACION/AJUSTE DE LOS COMPONENTES	15
3.2 BIENES O ADQUISICIONES.....	21
3.2.1. PRESUPUESTO	24
CAPITULO IV. ESTADO DE SITUACION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PPI TACANA.....	31
4.1. ESTADO DE SITUACIÓN.	31
CAPITULO V. MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PPI TACANA.....	33
5.1. ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PPI	33
5.1.1 Gerencia Regional La Paz - ABC	33
5.1.2 Empresa de Supervisión.....	33
5.1.3 Equipo técnico del PPI	34
5.1.4 Funciones y responsabilidades del Equipo Técnico del PPI	34
5.1.5 Consejo Indígena del Pueblo Tacana CIPTA	34
5.1.6 Empresa Contratista	35
CAPITULO VI. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CIERRE DE LA IMPLEMENTACION DEL PPI.....	36
6.1 MODALIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PPI	36
6.1.1. Seguimiento a implementación del PPI.....	36
6.1.2. Evaluación del PPI	36

6.2.	MEDIDAS DE CORRECCION.	37
6.3	CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI.	37
6.4	SISTEMA OPORTUNO DE ATENCION DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS.	37
ANEXOS		39
BIBLIOGRAFIA		50

GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

ABC	Administradora Boliviana de Carreteras
BM	Banco Mundial
CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CIMTA	Consejo de Mujeres Tacanas
CIPTA	Consejo Indígena del Pueblo Tacana
CONNAL – DOHWA	Supervisora Asociación Accidental CONNAL – DOHWA
CPE	Constitución Política de Estado
CPILAP	Central de Pueblos Indígenas de La Paz
FESPAI	Federación Sindical de Productores Agropecuarios Provincia Abel Iturralde
PPI	Plan de Pueblos Indígenas
PTDI	Planes Territoriales de Desarrollo Integral
TCO	Territorio Comunitario de Origen
TIOC	Territorio Indígena Originario Campesino
WCS	Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre

INDICE DE CUADROS

Cuadro N°1 Directiva CIPTA.....	10
Cuadro N° 2 COMPONENTE B: Fortalecimiento organizativo del CIPTA y CIMTA (ejecución de Plan de Gestión Territorial Indígena)	15
Cuadro N° 3 PPI 2021 – Bienes para el Pueblo Tacana	13
Cuadro N° 4 PPI Obras menores.....	14
Cuadro N° 5 Reuniones y eventos de consulta para ajuste del PPI...	21
Cuadro N° 6 PPI Tacana 2020 y ajuste PPI Tacana 2021-2022	23
Cuadro N° 7. Presupuesto PPI Tacana 2021-2022.....	26
Cuadro N°8 Obras de Infraestructura (licitación, adjudicación y PPI ´s)	31
Cuadro N°9 Personal técnico del PPI Tacana.....	34

INTRODUCCION

En cumplimiento a los términos y condiciones para la ejecución del Convenio de Financiamiento 4923-BO suscrito entre el Gobierno de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento (AIF); la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, ejecuta el Proyecto "Mejoramiento y Asfaltado de la Carretera San Buenaventura – Ixiamas" con recursos de crédito Banco Mundial, el objetivo de desarrollo del proyecto es mejorar la transitabilidad, durante todo el año, de la Ruta Fundamental San Buenaventura-Ixiamas

Teniendo en cuenta los posibles impactos socioeconómicos y culturales en las comunidades indígenas del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) Tacana I y en cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE), los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Salvaguarda activada del Banco Mundial OP/BM 4.10 de Pueblos Indígenas y los antecedentes de los niveles de coordinación que hubieron en el pasado entre la ABC conjuntamente el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y la comunidad Ese Ejja de Eyiyokuibo (beneficiarios), el presente documento reajusta el presupuesto del Plan de Pueblos Indígenas 2020 (PPI-2020) al periodo 2021 y 2022, es decir hasta el cierre de proyecto.

Cabe resaltar, que el reajuste, es producto del requerimiento de las Organizaciones Indígenas Tacana y Ese Ejja quienes priorizaron algunas acciones teniendo en cuenta la coyuntura, el periodo de ejecución y culminación del mismo previsto para agosto 2022. La asunción de nuevas autoridades en el CIPTA¹ permitió revisar las actividades y optimizar los recursos priorizando acciones que son favorables al cumplimiento de los objetivos del PPI, evitando de ese modo la dispersión de recursos económicos.

Por lo expresado, el presente presupuesto del PPI 2021-2022 Tacana mantiene sus 3 componentes:

- A. Fortalecimiento organizativo del CIPTA y CIMTA (ejecución de Plan de Gestión Territorial Indígena)
- B. Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I
- C. Control territorial y monitoreo de impactos socioambientales

De acuerdo al reporte de ABC respecto a la ejecución del PPI Tacana, registrado hasta la fecha, el PPI Tacana dispone de un saldo de 728.068,88 dólares americanos distribuidos en obras bienes y servicios e incorpora para su operativización a la Supervisión instancia privada que se ha adjudicado el servicio mediante licitación pública, para lo cual estará acompañado de un Equipo Técnico interdisciplinario que permita el logro del objetivo: "Salvaguardar al Pueblo Indígena en su identidad cultural, social, organizativo y manejo de su territorio de los posibles efectos que puedan generar la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera San Buenaventura – Ixiamas, con acciones de fortalecimiento a CIPTA".

ANTECEDENTES

El presente documento presenta el presupuesto aprobado del PPI Tacana para el periodo 2021-2022 por CIPTA/CIMTA en lo que corresponde a sus Componentes, sub componentes y actividades sumado a su presupuesto, cuyo resultado fue logrado en agosto de la presente gestión después de un proceso que conllevo reuniones y

¹ En el CIPTA, producto de la culminación de la gestión de su antigua directiva, nuevas autoridades asumieron en enero de 2020, cuya máxima representación es el Sr. Sergio Quenevo Cartagena, fungiendo la directiva sus responsabilidades hasta enero del 2022.

eventos de negociación y diálogo que culmina con el logro del objetivo, que es la aprobación del PPI Tacana y la elaboración del documento respaldatorio que tendrá el visto bueno del ente financiador.

Han transcurrido aproximadamente 7 años desde que el CIPTA aprobó y autorizó la firma del “Convenio Interinstitucional entre el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la ejecución del Plan para Pueblos Indígenas (PPI)””; sin embargo en un nuevo escenario y con una coyuntura adversa debido a la pandemia del COVID 19 y una crisis económica y social de la que no están exentos los pueblos indígenas y especialmente el Pueblo Tacana, el periodo de ejecución del presente plan se reduce de 60 meses a 14 (12 ahora considerando la fecha actual), cuyo inicio se remonta a agosto del presente año con la firma del convenio de la Supervisora quien en esta oportunidad se hará responsable de la ejecución del PPI en plena coordinación con la Organización matriz del Pueblo Tacana que es CIPTA.

Cabe expresar como antecedentes, que el PPI Tacana y Ese Ejja en el pasado (hasta septiembre de 2018) era operativizado de forma directa por la ABC Nacional en plena coordinación con el CIPTA, cuyos resultados preliminares han estado centrados en la adquisición parcial de bienes y el fortalecimiento de capacidades organizativas de la organización cuyo trabajo fue realizado por un equipo técnico de profesionales a cargo de estas instancias. Durante el 2018 y 2019, el PPI se reactivó con la actualización del documento considerando los resultados alcanzados a dicha fecha y se estableció la separación administrativa del PPI para el pueblo Tacana y PPI para el pueblo Ese Ejja, por medio de un equipo técnico específico para cada plan y la reprogramación de actividades considerando la coyuntura del momento; sumado a ello, la necesidad de actualizar los precios referenciales de las obras de infraestructura considerando el tiempo transcurrido.

Como ya se expresó, el presupuesto del PPI Tacana 2021-2022 ha conllevado reuniones y consensos que permitieron actualizar el presupuesto, por lo que ahora se dispone de un presupuesto de 728.068,88 dólares americanos que involucra obras de infraestructura – mayores y menores –, bienes a ser adquiridos y servicios. Los dos primeros (obras de infraestructura mayores y menores y bienes serán operativizados por las Empresas Contratistas que vienen ejecutando los Puentes de la Carretera San Buenaventura – Ixiamas para lo cual se hará un Contrato Modificatorio; mientras que los Servicios serán operativizados por las Organizaciones Indígenas con el apoyo del Equipo Técnico del PPI, bajo responsabilidad administrativa de los recursos por parte de la ABC Departamental.

No cabe duda que nos encontramos en un nuevo escenario, con desafíos importantes e interesantes, que de manera coordinada y con el esfuerzo del personal que está a cargo permitirá cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones del Pueblo Tacana.

CAPITULO I. BREVE CARACTERIZACION DEL PUEBLO TACANA

1.1 DATOS GENERALES

El Pueblo Indígena Tacana es uno de los 36 pueblos indígena originario campesino reconocidos por la CPE, cuya población (3.773 habitantes según CIPTA 2020) habitan en los departamentos de La Paz (norte) y Pando (sur). En el departamento de La Paz, el Pueblo Indígena Tacana ha logrado titular el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Tacana I cuya superficie es de 389.303,9809 has., cuyo territorio se encuentra en los municipios de San Buenaventura e Ixiamas, área de influencia del proyecto de mejora de la carretera San Buenaventura-Ixiamas.

La TCO Tacana colinda al sur con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (el más grande y rico en biodiversidad a nivel nacional), y la Reserva de la Biosfera y TCO Pilón Lajas, al norte con el Refugio de Vida Silvestre y Estancias Elsner-El Dorado, al este con el río Beni y al oeste con la TCO San Jose de Chupiamonas y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Constituida por 22 comunidades las mismas que albergan una población aproximada de 3.773 habitantes (CIPTA-WCS, 2002; CIPTA-CIMTA, 2014), cuyos habitantes viven en 8 comunidades del río Beni y 11 en el área de influencia de la carretera San Buenaventura- Ixiamas. Señalar también, que una parte importante de la población Tacana vive en los centros urbanos de Tumupasa y San Buenaventura.

En torno al territorio de la TCO Tacana I, su actividad económica gira en torno a la caza, pesca, recolección, agricultura de subsistencia y producción artesanal; sin embargo, su principal fuente de ingresos es la explotación de los recursos naturales, con énfasis en los recursos forestales.

Orgánicamente, el Pueblo Indígena Tacana está representado por el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) fundado en 1992 cuyo objetivo es "Regular y fortalecer el funcionamiento del CIPTA en lo social, económico, político, administración del territorio y manejo de los recursos naturales, medio ambiente, la justicia y la cultura"². Los niveles de decisión del CIPTA son:

- Gran Asamblea, es la instancia máxima de decisión encargada de definir políticas de la organización y se desarrolla cada 3 años. Está representada por seis representantes (3 hombres y 3 mujeres) elegidos por las comunidades miembro y 25 delegados de la población de Tumupasa.
- Consejo de Corregidores, es la instancia disciplinaria de control y fiscalización del Consejo Indígena del Pueblo Taca y se reúne 2 veces al año y de manera extraordinaria las veces que sea necesaria.
- Tribunal de Administración de Justicia Indígena Originario, que administra el tema de la justicia comunitaria dentro del Territorio de Consejo Indígena del Pueblo Tacana. Está conformado por 5 corregidores idóneos.
- Directorio del CIPTA, es la máxima instancia ejecutiva y está conformada por 5 personas: un presidente, un vicepresidente, una Secretaría de Tierra, Territorio, Autonomías y Desarrollo Productivo, una Secretaría de Educación, Salud y Cultura y una Secretaría de Recursos Naturales, Medio Ambiente, Investigación y Turismo. El tiempo de gestión del Directorio es de 3 años.

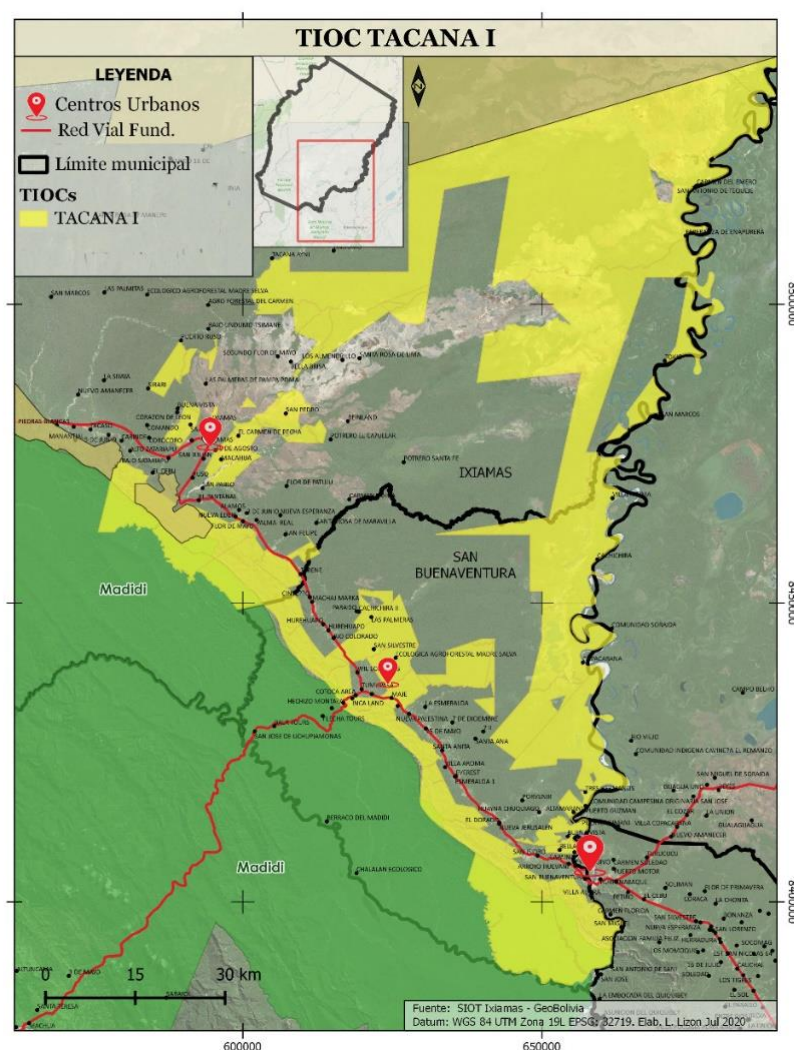
El CIPTA forma parte a nivel departamental de la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz) y a nivel nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) como representante máximo de los 34 pueblos indígenas del oriente, chaco y amazonia, cuya finalidad es defender los derechos de los pueblos indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia a través de la representación ante instancias públicas

² Estatuto Orgánico del Consejo Indígena del Pueblo Tacana - CIPTA

y o privadas y del fortalecimiento de sus organizaciones representativas, en la búsqueda de su efectiva incorporación y participación en decisiones políticas, sociales, económicas y culturales del País, en los ámbitos del desarrollo local, regional, nacional e internacional.

Con la finalidad de reforzar la participación de las mujeres, en 1996 se organizó el Consejo de Mujeres Tacanas, CIMTA cuyo objetivo es realizar actividades en beneficio para las mujeres y su organización. Actualmente el CIMTA promueve actividades de género, cultura y turismo para promover la artesanía tacana, la medicina, las fiestas, música, danzas y gastronomía tacanas, así como la promoción del fortalecimiento de la justicia comunitaria para el tratamiento de los casos de violencia en razón de género, violencia hacia las mujeres, niños, adolescentes y ancianos. Hace seguimiento a casos tratados por el Servicio Legal Integral Municipal, SLIM, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la brigada de protección a la familia.

Mapa 1. Territorio Indígena Originario Campesino TACANA I.



Entre las organizaciones que han y continúan apoyando al Pueblo Indígena Tacana esta la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) a partir del año 2000 en el denominado “paisaje Madidi” con un enfoque de conservación de las especies, paisajes locales y la biodiversidad. Entre los principales resultados está el haber contribuido a lograr la titulación de la TCO Tacana I o recientemente el Plan de Gestión Territorial 2015-2025 como instrumento para el ejercicio de la autonomía

indígena y el manejo integral de su territorio y sus recursos naturales, cuya información ahora es administrada por el CIPTA.

Cabe resaltar como resultado de estos procesos, el aprovechamiento sostenible del cuero de lagarto cuyo manejo está bajo responsabilidad de la Asociación Matusha Aidha integrada por 27 socios de 4 comunidades del río Beni. Otro resultado tangible es el establecimiento de 24 asociaciones de base comunitaria que benefician al 53% de las familias Tacana o el control de la tala y la extracción ilegal de productos no madereros del bosque.

1.2 SITUACIONES QUE DETERMINAN EL AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DEL PPI

El PPI Tacana 2020 aprobado en octubre del mismo año, ha conllevado ajustes que se consolidan a fines del mes de agosto del 2021, el mismo que es parte del presente documento.

Las causas que conllevan a su ajuste, está centrado en lo siguiente:

a) Ejecución del PPI 2021 -2022 a cargo de la empresa de Supervision

A pesar de las dificultades que tuvo la operativización del PPI hasta fines del 2020 a cargo de la ABC, cabe expresar que se desarrollaron varias actividades en beneficio de los pueblos indígenas Tacana y Ese Ejja, especialmente aquellos concernientes a las adquisiciones que fueron entregadas a sus organizaciones matrices.

Por lo señalado y considerando que ABC en coordinación con el ente financiador tomo la decisión de terciarizar la ejecución del PPI a la futura empresa Supervisora adjudicada, esto conlleva a que las actividades fueran reprogramadas y ajustadas al tiempo que establecía la licitación futura.

b) Cambio de dirigentes en el CIPTA y redefinición de prioridades

En diciembre del 2020 y cumpliendo con el Estatuto y Reglamento del CIPTA, se realizó la Gran Asamblea del Pueblo Tacana donde asumieron nuevas autoridades por un periodo de 3 años, cuyas autoridades son:

Cuadro N°1 Directiva CIPTA

Cargo	Nombre
Presidente	Sergio Saul Quenevo Cartagena
Vicepresidente	Kemel Fessy Gonzales
Secretaria de Tierra, Territorio y Autonomía	Teodoro Jose Beyuma Cartagena
Secretaria de Recursos Naturales y Turismo	Darío Mamio Serato
Secretaria de Educación, Salud y Cultura	Etty Nazaret Marupa Beyuma

Elaboración propia.

El escenario del COVID que afecto a los pueblos indígenas y de manera específica al pueblo Tacana y el nuevo escenario económico y social, conlleva a que la dirigencia de la CIPTA recomiende hacer ajustes al PPI, el mismo que llevo gestiones ante la ABC por un periodo de 7 meses que culmino con los acuerdos suscritos y el visto bueno al actual PPI.

c) Reducción del periodo de ejecución del PPI

El periodo inicial de ejecución inicial del PPI correspondía a ser ejecutado en 60 meses (5 años), lo que significaba todo un proceso de empoderamiento a las organizaciones indígenas y desarrollo de actividades participativas a cargo de la ABC quien fungía como operativizadora del proceso y por lo tanto como responsable del mismo.

En este marco, el Equipo Técnico del PPI estaba a cargo de la ABC y se disponía del “tiempo necesario” para desarrollar las actividades programadas que iban paralelo a la ejecución de la Carretera San Buenaventura – Ixiamas, previsto a ejecutarse en similar tiempo; sin embargo, la paralización del Proyecto carretero incidió en el avance.

La disponibilidad de un periodo más corto de 12 meses (julio 2021 – julio 2022) de terminado por la fecha de cierre del proyecto, guio el diálogo para que se prioricen las actividades y por lo tanto también haya ajustes en el presupuesto, aspecto que pudo concretarse después de varias reuniones a definir y aprobar el presente presupuesto del PPI Tacana.

CAPITULO II. ACCIONES ESTRATEGICAS Y AVANCES ALCANZADOS

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo General³

El objetivo del PPI Tacana, es salvaguardar al Pueblo Indígena en su identidad cultural, social, organizativo y manejo de su territorio de los posibles efectos que puedan generar la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera San Buenaventura – Ixiamas (construcción 22 puentes), con acciones de fortalecimiento a CIPTA

2.1.2 Objetivos específicos

Para el pueblo Tacana I:

- a) Consolidar el PPI aprobado el 2020 a través de un ajuste presupuestario para una ejecución rápida y expedita.
- b) Fortalecer las capacidades organizativas y de gestión del CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana) y CIMTA (Consejo de Mujeres Tacana).
- c) Fortalecer la identidad étnico-cultural del pueblo Tacana tomando en cuenta los enfoques de derechos, intraculturalidad, interculturalidad y equidad de género y generacional.
- d) Promover el Control territorial y vigilancia de impactos socio ambientales en la TCO Tacana I y el área colindante al Proyecto.

Cada uno de estos objetivos se constituyeron en componentes y subcomponentes del PPI, e integraron un conjunto de actividades; cada componente contempla las siguientes líneas de acción:

2.2 COMPONENTES

COMPONENTE A: Fortalecimiento organizativo del CIPTA y CIMTA

- ✓ Apoyo a los espacios de reflexión y análisis interno a través de reuniones del directorio, asambleas consultivas, CPILAP y CIDOB.
- ✓ Apoyo para gestiones ante el poder ejecutivo, municipios, gobernaciones, ONGs, y otros.
- ✓ Diseño de un fondo fiduciario y búsqueda de financiamiento.
- ✓ Elaboración final de ideas proyectos de forma participativa en base al PGTI
- ✓ Unidad operativa – Coordinador, Administrador, Chófer, Técnico Forestal, Apoyo Social, Abogado, Material de escritorio, combustible y mantenimiento

COMPONENTE B: Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I

- ✓ Nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa (construcción).
- ✓ Equipamiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa.
- ✓ Impresión, publicación y difusión del libro de la cultura Tacana tanto en español y como en Tacana.

³ El objetivo del PPI Tacana no ha sido modificado, el objetivo es el mismo que fue formulado en la elaboración del PPI el año 2011 y ratificado en el Manual de Operaciones del PPI el año 2016. Para ratificar esta situación se convocó a la máxima dirigencia del PI Tacana y se revisó el Objetivo del PPI, ellos después de verificar el Objetivo en el documento del PPI ratificaron que no hubo modificación alguna (Ver Acta de la Reunión Anexo No 2 de este documento). De la misma forma las autoridades refirieron que, la única modificación realizada fue la separación del Componente D que competía al Pueblo Indígena Ese Ejja, esto ha implicado la elaboración de un PPI Ese Ejja para la comunidad de Eyiyoquibo específico, conjuntamente su administración. Esto ha sido consensuado con cada Pueblo Indígena, además este proceso fue realizado como recomendación del Banco Mundial y operado por la ABC.

- ✓ Fortalecimiento del idioma Tacana a través de la gestión del instituto lingüístico de lengua y cultura ILC Tacana
- ✓ Apoyo a la formación profesional de jóvenes Tacanas a través de la construcción, equipamiento y funcionamiento de un internado en San Buenaventura

COMPONENTE C: Control territorial y monitoreo de impactos socio ambientales

- ✓ Estrategia de control territorial
- ✓ Equipamiento para el control y vigilancia del territorio de la TCO
- ✓ Ejecución del control territorial a través de los Guarda TCOs

2.3 AVANCES EN LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

La adquisición de bienes corresponde a varios componentes, como se pueden observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2. PPI 2021 – Bienes para el Pueblo Tacana.

N°	Componente/Subcomponente/Actividad	Presupuesto \$US
B	Componente: Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I	77.862,81
b.2	Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa	15.245,53
b.2.6	Equipamiento del corregimiento del pueblo Tacana en Ixiamas	5.000,00
b.2.8	TV 55' y equipo de sonido	1.600,00
b.2.10	Adquisición de equipo para Radio Tacana	8.645,53
b.5	Fortalecimiento del idioma Tacana a través de la gestión del instituto de lengua y cultura (ILC) Tacana.	6.000,00
b.5.2	Equipamiento del ILC (Equipos e Instrumento Musicales)	6.000,00
b.6	Apoyo a la formación profesional de jóvenes Tacanas a través de la construcción, equipamiento y funcionamiento de un internado en San Buenaventura	20.937,17
b.6.3	Equipamiento del internado para 30 personas	20.937,17
b.7	Equipamiento inicial del museo para promover la cultura del pueblo Tacana en Tumupasa	7.000,00
b.7.1	Compra de Artesanías - Tacana (para exhibición)	7.000,00
b.8	Implementación de un centro de producción de bordados con motivos culturales Tacana	28.680,11
b.8.3	Adquisición de maquina bordadora	24.645,53
b.8.6	Adquisición de materiales de producción	4.034,58
B	Componente: Control territorial y monitoreo de impactos socioambientales.	14.346,77
c.2	Equipamiento para el control y vigilancia del territorio de la TCO	8.206,77
c.2.6	Drone	4.000,00
c.2.7	Motor peque peque de 16HP (1)	1.324,93

c.2.8	Lancha para peque peque (1)	2.881,84
	Ejecución del control territorial a través de los guardas TCO	6.140,00
c.4.1	Equipamiento para control y monitoreo territorial	1.000,00
c.4.7	Compra de neumáticos	640,00
c.4.9	Compra de bote de madera (para deslizador)	4.500,00

Elaboración propia

2.4 CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBRAS MENORES

La construcción de obras de infraestructura prevista por el PPI son las siguientes:

Cuadro N° 3 PPI Obras menores.

N°	Componente/Subcomponente/Actividad	Presupuesto \$US	Lugar
B	Componente: Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I		
b.1	Nueva Infraestructura del CIPTA en Tumupasa (Diseño y Construcción)	11.912,89	
b.1.3	Amurallado de perímetro de nueva oficina del CIPTA	11.912,89	TUMUPASA
b.2	Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa	18.910,54	
b.2.3	Refacción y adecuación de oficina de Ixiamas	6.997,65	IXIAMAS
b.2.5	Construcción de muro Perimetral corregimiento del pueblo Tacana en Tumupasa	11.912,89	TUMUPASA
b.8	Implementación de un centro de producción de bordados con motivos culturales Tacana	10.636,65	
b.8.1	Reparación y ampliación de taller de bordados	10.636,65	TUMUPASA

Elaboración propia

CAPITULO III COMPLEMENTACIONES Y CAMBIOS AL PPI TACANA AL 2021

3.1. JUSTIFICACION DE COMPLEMENTACION/AJUSTE DE LOS COMPONENTES

Los componentes y subcomponentes del PPI no han tenido mayores avances; del mismo modo varias actividades se han mantenido y otras se han ajustado o mejorado.

En lo que concierne a avances de las actividades previstas, estas han sido esporádicas debido a los procesos de coordinación y contratación del personal técnico para darle operatividad al PPI Tacana.

Asi mismo, en el marco de un proceso que conllevara a un Contrato Modificatorio, se ha subdividido el PPI en 3 tipo de actividades: Obras (mayores y menores), Bienes y Servicios por lo que las obras mayores ya han sido adjudicadas con anterioridad mientras que las Obras Menores serán transferidas para su ejecución a las Empresas Contratistas al igual que los Bienes o denominadas adquisiciones. Por dicho motivo, en los siguientes cuadros, se las identifica producto de un proceso de identificación que se ha realizado hasta el presente y que después de un procedimiento a seguir deberán ser las Empresas Contratistas quienes se adjudiquen para luego comprarlas y construirlas respectivamente.

Cuadro N° 2

COMPONENTE A: Fortalecimiento organizativo del CIPTA y CIMTA (ejecución de Plan de Gestión Territorial Indígena)

PPI 2020		PPI 2021-2022			
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 Fortalecer las capacidades organizativas y de gestión del CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana) y CIMTA (Consejo de Mujeres Tacana).					
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	ACTIVIDADES CONCLUIDAS	ACTIVIDADES NUEVAS Y RATIFICADAS 2021-2022	INDICADOR 2021-2022	AVANCES 2021
R.1.1 Fortalecimiento organizativo del CIPTA y CIMTA (ejecución de Plan de Gestión Territorial Indígena)	a.1 Difusión del plan de vida de las comunidades de la TCO Tacana	a.1 Difusión del plan de vida de las comunidades de la TCO Tacana			No corresponde la actividad ha sido ejecutada y concluida
	a.2 Difusión y actualización de normas de la TCO y comunidades		a.2 Difusión y actualización de normas de la TCO y comunidades	Diseño, diagramación, impresión y socialización del Estatuto de la TCO	CIPTA aprobó su Estatuto y Reglamento Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA, tanto para la gestión 2021 y 2022.
	a.3 Apoyo a los espacios de reflexión		a.3 Apoyo a los espacios de reflexión y	Número de Asambleas Consultivas	CIPTA desarrollo Directorios y Reuniones

<i>y análisis interno a través de reuniones del directorio, asambleas consultivas, CPILAP y CIDOB.</i>		análisis interno a través de reuniones del directorio, asambleas consultivas, CPILAP y CIDOB.	<i>, de Directorio y Extraordinarias desarrolladas según planificación anual</i>	<i>extraordinarias con recursos propios</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para la gestión 2021 y 2022.</i>
<i>a.4 Apoyo para gestiones ante el poder ejecutivo, municipios, gobernaciones, ONGs, otros)</i>		a.4 Apoyo para gestiones ante el poder ejecutivo, municipios, gobernaciones, ONGs, otros)	<i>Nro. de viajes o reuniones de los Dirigentes y técnicos para realizar gestiones para desarrollar la Gestión Territorial Indígena</i>	<i>CIPTA desarrollo Directorios y Reuniones extraordinarias con recursos propios.</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para la gestión 2021 y 2022.</i>
<i>a.5 Diseño de un fondo fiduciario y búsqueda de financiamiento.</i>		a.5 Diseño de un fondo fiduciario y búsqueda de financiamiento.	<i>Consultor para elaboración de estrategia de fondo fiduciario.</i>	<i>Reuniones de coordinación para definir contratación de Consultor</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para la gestión 2021.</i>
<i>a.6 Elaboración final de ideas proyectos de forma participativa en base al PGTI</i>		a.6 Elaboración final de ideas proyectos de forma participativa en base al PGTI	<i>No de Hombres y mujeres con capacidades para elaborar proyectos</i>	<i>Sin avance</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para la gestión 2022.</i>
<i>a.7. Unidad operativa</i>		a.7. Unidad operativa	<i>Equipo Técnico contratado</i> <i>Gastos de Funcionamiento del CIPTA</i>	<i>Personal contratado:</i> <i>Coordinador</i> <i>Administrador</i> <i>Técnico Forestal</i> <i>Apoyo Social</i> <i>Chofer</i>

					<i>Gastos de Funcionamiento CIPTA</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para la gestión 2021 y 2022.</i>
--	--	--	--	--	--

COMPONENTE B: Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I					
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	ACTIVIDADES CONCLUIDAS	ACTIVIDADES NUEVAS Y RATIFICADAS 2021-2022	INDICADOR 2021-2022	AVANCES 2021
<i>R.1.2</i> <i>Fortalecer la identidad étnico-cultural del pueblo Tacana tomando en cuenta los enfoques de derechos, interculturalidad, interculturalidad y equidad de género y generacional.</i>	b.1 Nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa (diseño y construcción).		b.1 Nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa (diseño y construcción) Amurallado de perímetro de nueva oficina del CIPTA	<i>Infraestructura para oficinas del CIPTA construida, así como amurallado de perímetro</i>	<i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificadorio debido a la diferencia de cambio existente.</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para la gestión 2022.</i>
	b.2 Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa. Construcción muro perimetral		b.2 Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa. Refacción adecuación oficina ixiamas Construcción muro perimetral	<i>Oficina de CIPTA – Tumupasa equipada con:</i> - TV 55' y equipo de sonido - Cámara de vigilancia - Equipo de radio TACANA <u><i>Oficina de Ixiamas refaccionada</i></u> <u><i>Muro perimetral</i></u>	<i>Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificadorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes y obras menores para adjudicación a Empresas Contratistas.</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-</i>

				<u>de</u> <u>Corregimiento Pueblo Tacana en Tumupasa construido</u> Gastos de funcionamiento pagados mensualmente	CIMTA para la gestión 2022.
	b.3 Traducción del libro de la cultura Tacana Del alemán al español	b.3 Traducción del libro de la cultura Tacana Del alemán al español			
	b.4 Impresión, publicación y difusión del libro de la cultura Tacana tanto en español y como en Tacana.		b.4 Impresión, publicación y difusión del libro de la cultura Tacana tanto en español y como en Tacana.	Publicación de la Traducción del libro de la Cultura Tacana	ABC ha realizado la impresión del libro de la cultura Tacana. Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para la gestión 2022.
	b.5 Fortalecimiento del idioma Tacana a través de la gestión del instituto lingüístico de lengua y cultura ILC Tacana		b.5 Fortalecimiento del idioma Tacana a través de la gestión del instituto lingüístico de lengua y cultura ILC Tacana	Talleres para la elaboración de Planes y Programas	Sin avance Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para las gestiones 2021 y 2022.
	b.6 Apoyo a la formación profesional de jóvenes Tacanas a través de la construcción, equipamiento y funcionamiento de un internado en		b.6 Apoyo a la formación profesional de jóvenes Tacanas a través de la construcción, equipamiento y funcionamiento de un internado en	Construcción de Internado Equipamiento del internado para 30 personas	Supervisión viene elaborando la Propuesta de Contrato Modificadorio donde se incorporará el equipamiento o adquisición de bienes y obras menores para adjudicación a

	San Buenaventura		San Buenaventura		Empresas Contratistas. Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para las gestiones 2021 y 2022.
	b.7 Equipamiento inicial de un museo para promover la cultura del pueblo Tacana en Tumupasa		b.7 Equipamiento inicial de un museo para promover la cultura del pueblo Tacana en Tumupasa	Compra de Artesanías - Tacana (para exhibición)	Sin avance Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para las gestiones 2021 y 2022.
			b.8 Implementación de un centro de producción de bordados con motivos culturales Tacana	Reparación taller de bordados y adquisición de maquinaria	Sin avance Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para la gestión 2022.

COMPONENTE C: Control territorial y monitoreo de impactos socio ambientales

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 Promover el Control territorial y monitoreo de impactos socio ambientales					
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	DESESTIMACIONES	ACTIVIDADES LEGITIMADAS 2021-2022	INDICADOR 2021-2022	AVANCES 2021
R.1.2 Promover el Control territorial y vigilancia de impactos socio ambientales en la TCO Tacana I y el área colindante	c.1 Estrategia de control territorial		c.1 Estrategia de control territorial	Implementación de Control y Monitoreo Territorial de la TCO tacana	CIPTA ha elaborado un borrador de Estrategia para el Control y Monitoreo de la TCO Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para la gestión 2022.

<i>al Proyecto.</i>	<i>c.2 Equipamiento para el control y vigilancia del territorio de la TCO</i>	<i>c.2 Equipamiento para el control y vigilancia del territorio de la TCO (actividad parcial)</i> <i>- Adquisición de vehículo-camioneta</i> <i>- Brújula</i> <i>- GPS</i> <i>- Motor fuera de borda 40 HP</i> <i>- Adquisición de motocicleta</i>	<i>c.2 Equipamiento para el control y vigilancia del territorio de la TCO</i>	<i>Equipamiento adquirido</i> <i>1 Drone</i> <i>1 Motor pequeño 16 HP (Orden de Compra)</i> <i>1 Lancha para pequeño</i>	<i>Sin avance</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para la gestión 2022.</i>
	<i>c.3 Capacitación al equipo de control territorial</i>	<i>c.3 Capacitación al equipo de control territorial</i>			
	<i>c.4 Ejecución del control territorial a través de los guardas TCOs</i> <i>Apoyo al trabajo de Guardas TCO</i> <i>Alimentación de Guardas TCO</i> <i>Adquisición de combustible</i> <i>Mantenimiento de camioneta</i> <i>Compra de neumáticos</i>		<i>c.4 Ejecución del control territorial a través de los guardas TCOs</i> <i>Apoyo al trabajo de Guardas TCO</i> <i>Alimentación de Guardas TCO</i> <i>Adquisición de combustible</i> <i>Mantenimiento de camioneta</i> <i>Compra de neumáticos</i>	<i>Equipo de control y monitoreo territorial adquirido</i> <i>Servicio de alimentación de Guardas TCO pagado</i> <i>Adquisición de combustible</i> <i>Mantenimiento de camioneta</i> <i>Compra de neumáticos</i> <i>Compra de bote de madera</i>	<i>Sin avance</i> <i>Las actividades se mantienen anualmente según planificación en el POA de CIPTA-CIMTA para las gestiones 2021 y 2022.</i>

Elaboración propia.

3.2 BIENES O ADQUISICIONES

La adquisición de bienes ha sido transferida a la Empresas Contratistas para su compra y entrega al Pueblo Tacana, por lo que se elaborará un Contrato Modificatorio para legalizar el proceso. Estos bienes corresponden a varios componentes, como se pueden observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3. PPI 2021 – Bienes para el Pueblo Tacana.

N°	Componente/Subcomponente/Actividad	Presupuesto \$US
B	Componente: Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I	77.862,81
b.2	Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa	15.245,53
b.2.6	Equipamiento del corregimiento del pueblo Tacana en Ixiamas	5.000,00
b.2.8	TV 55' y equipo de sonido	1.600,00
b.2.10	Adquisición de equipo para Radio Tacana	8.645,53
b.5	Fortalecimiento del idioma Tacana a través de la gestión del instituto de lengua y cultura (ILC) Tacana.	6.000,00
b.5.2	Equipamiento del ILC (Equipos e Instrumento Musicales)	6.000,00
b.6	Apoyo a la formación profesional de jóvenes Tacanas a través de la construcción, equipamiento y funcionamiento de un internado en San Buenaventura	20.937,17
b.6.3	Equipamiento del internado para 30 personas	20.937,17
b.7	Equipamiento inicial del museo para promover la cultura del pueblo Tacana en Tumupasa	7.000,00
b.7.1	Compra de Artesanías - Tacana (para exhibición)	7.000,00
b.8	Implementación de un centro de producción de bordados con motivos culturales Tacana	28.680,11
b.8.3	Adquisición de maquina bordadora	24.645,53
b.8.6	Adquisición de materiales de producción	4.034,58
B	Componente: Control territorial y monitoreo de impactos socioambientales.	14.346,77
c.2	Equipamiento para el control y vigilancia del territorio de la TCO	8.206,77
c.2.6	Drone	4.000,00
c.2.7	Motor peque peque de 16HP (1)	1.324,93
c.2.8	Lancha para peque peque (1)	2.881,84
	Ejecución del control territorial a través de los guardas TCO	6.140,00
c.4.1	Equipamiento para control y monitoreo territorial	1.000,00
c.4.7	Compra de neumáticos	640,00
c.4.9	Compra de bote de madera (para deslizador)	4.500,00

Elaboración propia

2.4 CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES

Del mismo modo que los Bienes, se ha establecido que la construcción de obras menores de infraestructura prevista por el PPI será responsable de la Empresa Contratista una vez que se firme el Convenio Modificadorio. Por lo señalado y enmarcado en el PPI Tacana la construcción de Obras Menores corresponden a:

Cuadro N° 4 PPI Obras menores.

N°	Componente/Subcomponente/Actividad	Presupuesto \$US	Lugar
B	Componente: Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I		
b.1	Nueva Infraestructura del CIPTA en Tumupasa (Diseño y Construcción)	11.912,89	
b.1.3	Amurallado de perímetro de nueva oficina del CIPTA	11.912,89	TUMUPASA
b.2	Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa	18.910,54	
b.2.3	Refacción y adecuación de oficina de Ixiamas	6.997,65	IXIAMAS
b.2.5	Construcción de muro Perimetral corregimiento del pueblo Tacana en Tumupasa	11.912,89	TUMUPASA
b.8	Implementación de un centro de producción de bordados con motivos culturales Tacana	10.636,65	
b.8.1	Reparación y ampliación de taller de bordados	10.636,65	TUMUPASA

Elaboración propia

3.2. CONSULTAS PARA AJUSTAR EL PLAN INDIGENA DEL PUEBLO TACANA Y SU PRESUPUESTO

Antes de la aprobación del PPI Tacana en agosto de 2021, los procesos de coordinación, consulta y consenso han sido ampliamente participativos entre la ABC Nacional, ABC Departamental La Paz y el CIPTA donde técnicos y dirigentes han participado en reuniones y talleres para lograr el objetivo.

Entre los eventos realizados que resaltan entre el periodo de octubre 2020 (PPI 2020) y agosto del 2021 (PPI 2021-2022 están:

Cuadro N° 5 Reuniones y eventos de consulta para ajuste del PPI

Fecha	Actividad y temas tratados	Participantes	Acuerdos o decisiones
23 abril 2021	Carta CIPTA Coordinación PPI Tacana		Invitación a ABC para analizar Ejecución presupuestaria PPI, Socialización de planos y Planificación componentes A, B y c
05 mayo 2021	Carta ABC/GNT/SSA/2021-0120 Respuesta a nota del 23 de abril de 2021		Respuesta para confirmar temario y participación a reunión el 07 de mayo de 2021
07 mayo 2021	Reunión ABC - CIPTA (Anexo Acta) Obras de Infraestructura Libro Tacana Guardas TCO	Carlos Laruta ABC Concejo CIPTA-CIMTA	Presentación de planos y construcción en 7 meses previo a la culminación del PPI Elaboración en 2 meses Contratación inmediata
30 junio 2021	Carta CIPTA Cite SOL/OF/CIPTA/N0166/2021 Presentación PPI Tacana ajustado Gestión 20-21 (Anexo)		Presentación oficial del PPI Tacana para el periodo 2021, con ajustes realizados en base a ejecución y saldos.
03 agosto 2021	Reunión ABC - CIPTA - Supervisión Aprobación PPI Obras menores Adquisición de equipos Impresión libro Tacana	Christian Rodríguez ABC Luis Sivila y Rosario Velásquez Supervisión Concejo CIPTA CIMTA	Aprobación del PPI Mantenimiento de obras menores Adquisición de equipos según demanda del CIPTA En proceso de impresión el libro

Elaboración propia.

Con la definición de terciarizar la operativización del PPI por medio de la Supervisión y su posterior adjudicación, se allanaron varios aspectos que conllevaron a realizar reuniones de coordinación y aclaración que permite el resultado de aprobación del PPI 2021 en cuanto se refiere a sus componentes y su presupuesto para el periodo 2021-2022.

No cabe duda que ahora el desafío está puesto en lograr los objetivos del PPI cumpliendo a cabalidad cada una de las actividades en el marco del presupuesto establecido en el periodo de 8 meses. Sin embargo, la voluntad de la organización

matriz del Pueblo Tacana (CIPTA), acompañados y asesorados por el personal técnico contratado que son y representan a su mismo pueblo conlleva a que los resultados sean satisfactorios en bien de todo el Pueblo Tacana.

3.2.1. PRESUPUESTO

a) COMPLEMENTACION AL PPI 2021-2022

A continuación, se hace referencia al Ajuste al Presupuesto del PPI 2020 que conllevo a la elaboración del PPI 2021-2022 y que fue aprobado por CIPTA (Cite/OF/CIPTA/Nº 0223 recepcionada el 15 de septiembre del 2021) en función a las actividades priorizadas y otras nuevas propuestas por la organización matriz del Pueblo Tacana y que se constituye, en ultima instancia, en la oficial para su implementación por parte de la Supervisión.

En tal sentido, lo descrito a continuación hace referencia a un análisis de las complementaciones existentes identificadas en los documentos y que concierne a los Componentes, Sub Componentes y Actividades.

Observaciones generales:

- Se identifica que los PPI's aprobados en la gestión 2020, incluyen las "Actividades de contingencia en el marco de la pandemia del COVID-19", por lo que se constituye en un solo documento y por lo tanto en un solo presupuesto.
- Los Componentes son respetados en ambos PPI's, no habiendo complementación alguna, por lo que son tres: A: Fortalecimiento organizativo del CIPTA y CIMTA (ejecución de Plan de Gestión Territorial Indígena), B: Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I, y C: Control territorial y monitoreo de impactos socioambientales.

Observaciones específicas:

- Los Subcomponentes tienen pequeñas variaciones en el contenido de los documentos, que no son significativos.

En el presupuesto de infraestructura y apoyo a la gestión.

El presupuesto inicial para el pueblo Tacana alcanzaba a \$us. 759,502.11, al 31 de diciembre de 2020 se ha alcanzado una ejecución presupuestaria de \$us. 217,888.31 quedando un saldo a favor de \$us. 541,613.80 Debido al tiempo transcurrido desde la formulación del PPI y para la continuidad de las actividades a través de la Empresa de Supervisión el presupuesto ha sido actualizado y se ha incrementado a \$us 631,348.88 Que debe ser ejecutado en los próximos meses.

- El presupuesto general de los PPI's (tomando en cuenta lo programado y no lo ejecutado) ha variado, con un saldo favorable para los Pueblos Indígenas de USD 89,735.08
- En términos generales, se observa que en los Sub Componentes existen variaciones significativas en el PPI Tacana en los Sub Componentes: a.2 "Apoyo a los espacios de reflexión y análisis interno a través de reuniones de directorio, Asambleas, consultivas, CPILAP y CIDOB", b.2 "Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa", b.5 "Fortalecimiento del idioma Tacana a través de la gestión del Instituto de Lengua y Cultura (ILC) Tacana" ó b.7 "Equipamiento inicial del museo para promover la cultura del pueblo Tacana en Tumupasa" con incrementos de USD 28.608,49, 45.656,07, 23.135,26 y 40.889,52 respectivamente. La diferencia negativa no se

observa teniendo en cuenta que no se realizó una sumatoria correcta en el Componente C: "Control territorial y monitoreo de impactos socioambientales".

Cuadro N° 6. PPI Tacana (2020 y 2021-2022).

	ALCANCE PPI Actualizado al 2020 (*)		ALCANCE PPI Aprobado 2021 por TACANA (CIPTA) (**)		DIFERENCIA S A-B
	COMPONENTES, SUB COMPONENTE/ ACTIVIDAD (A)	Presupuesto Ajustado 2020	COMPONENTES, SUB COMPONENTE/ ACTIVIDAD (B)	Presupuest o 2021- 2022	
A	Componente: Fortalecimiento organizativo del CIPTA y CIMTA (ejecución de Plan de Gestión Territorial Indígena)	193.489,60	Componente: Fortalecimiento organizativo del CIPTA y CIMTA (ejecución de Plan de Gestión Territorial Indígena)	183.753,44	(-) 9.735,56
a.1	Difusión del Plan de Vida en las comunidades de la TCO Tacana I	0,00	Difusión y actualización de normas de la TCO y comunidades	4.755,04	4.755,04
a.2	Apoyo a los espacios de reflexión y análisis interno a través de reuniones de directorio, Asambleas, consultivas, CPILAP y CIDOB	4.077,52	Apoyo a los espacios de reflexión y análisis interno a través de reuniones de directorio, Asambleas, consultivas, CPILAP y CIDOB	32.686,01	28.608,49
a.3	Apoyo para gestiones ante el poder ejecutivo, municipios, gobernaciones, ONGs, otros)	4.000,00	Apoyo para gestiones ante el poder ejecutivo, municipios, gobernaciones, ONGs, otros)	12.560,16	8.560,16
a.4	Diseño de un Fondo Fiduciario y Búsqueda de Financiamiento	13.994,17	Diseño de un Fondo Fiduciario y Búsqueda de Financiamiento	14.000,00	5,83
a.5	Elaboración final de proyectos de forma participativa en base al PGTI	8.000,00	Elaboración final de proyectos de forma participativa en base al PGTI	7.000,00	(-) 1.000,00
a.6	Unidad operativa - Coordinador, Administrador, Chófer, Material de escritorio, Combustible y Mantenimiento	120.108,93	Unidad operativa del PPI	112.752,22	(-) 7.356,71
B	Componente: Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I	372.593,30	Componente: Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I	502.203,07	129.610,07
b.1	Nueva Infraestructura del CIPTA en	178.571,43	Nueva Infraestructura del	190.484,32	11.912,89

	ALCANCE PPI Actualizado al 2020 (*)		ALCANCE PPI Aprobado 2021 por TACANA (CIPTA) (**)		DIFERENCIA S A-B
	COMPONENTES, SUB COMPONENTE/ ACTIVIDAD (A)	Presupuesto Ajustado 2020	COMPONENTES, SUB COMPONENTE/ ACTIVIDAD (B)	Presupuest o 2021- 2022	
	Tumupasa (Diseño y Construcción)		CIPTA en Tumupasa (Diseño y Construcción) (****)		
b.2	Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa	0,00	Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa	45.656,07	45.656,07
b.3	Traducción del libro de la cultura Tacana de Alemán-español	0,00	Traducción del libro de la cultura Tacana de Alemán-español	0,00	0,00
b.4	Impresión, publicación y difusión del libro de la cultura Tacana tanto en español como en Tacana	14.998,00	Impresión, publicación y difusión del libro de la cultura Tacana tanto en español como en Tacana	14.998,00	0,00
b.5	Fortalecimiento del idioma Tacana a través de la gestión del Instituto de Lengua y Cultura (ILC) Tacana.	3.000,00	Fortalecimiento del idioma Tacana a través de la gestión del instituto de lengua y cultura (ILC) Tacana.	26.135,26	23.135,26
b.6	Apoyo a la formación profesional de jóvenes Tacanas a través de la construcción, equipamiento y funcionamiento de un internado en San Buenaventura	174.289,90	Apoyo a la formación profesional de jóvenes Tacanas a través de la construcción, equipamiento y funcionamiento de un internado en San Buenaventura	174.289,90	0,00
b.7	Equipamiento inicial del museo para promover la cultura del pueblo Tacana en Tumupasa	2.750,00	Equipamiento inicial del museo para promover la cultura del pueblo Tacana en Tumupasa	43.639,52	40.889,52
C	Componente: Control territorial y monitoreo de impactos socioambientales.	372.593,30 (**)	Componente: Control territorial y monitoreo de impactos socioambientales.	42.112,37	330.480,93 (***)
c.1	Estrategia de control territorial	0,00	Estrategia de control territorial	1.500,00	1.500,00
c.2	Equipamiento para el control y vigilancia del territorio de la TCO	0,00	Equipamiento para el control y vigilancia del territorio de la TCO	8.206,77	8.206,77

	ALCANCE PPI Actualizado al 2020 (*)		ALCANCE PPI Aprobado 2021 por TACANA (CIPTA) (**)		DIFERENCIA S A-B
	COMPONENTES, SUB COMPONENTE/ ACTIVIDAD (A)	Presupuesto Ajustado 2020	COMPONENTES, SUB COMPONENTE/ ACTIVIDAD (B)	Presupuest o 2021- 2022	
c.3	Capacitación al equipo de control territorial	4.000,00	Capacitación al equipo de control territorial y comunidades	0,00	(-) 4.000,00
c.4	Ejecución del control territorial a través de los guardas TCO	13.823,85	Ejecución del control territorial a través de los guardas TCO	32.405,60	(-) 18.581,75
c.5			Señalización de puntos estratégicos en la TCO	0,00	0,00
SUB TOTAL PPI		541.613,80		728.068,88	

Elaboración propia sobre la base de PPI Actualizado al 2020 y Presupuesto aprobado por Eje Ejja en septiembre 2021

(**) La sumatoria del Componente no corresponde a lo señalado

(***) La diferencia no corresponde por la mala sumatoria realizada en el PPI 2020

(****) Estas actividades incluyen construcciones o refacciones adicionales (ej. Refacción y adecuación de oficinas de Ixiamas, Construcción de muro perimetral corregimiento del pueblo Tacana o Reparación y ampliación de taller de bordados), cuyas carpetas han sido presentadas por CIPTA a Supervisión.

b) PRESUPUESTO PPI 2021-2022

Cuadro N° 7. Presupuesto PPI Tacana 2021-2022.

PPI Aprobado 2021 por TACANA (CIPTA)		
	COMPONENTES, SUB COMPONENTE/ ACTIVIDAD (B)	Presupuesto 2021-2022 USD
A	Componente: Fortalecimiento organizativo del CIPTA y CIMTA (ejecución de Plan de Gestión Territorial Indígena)	183.753,44
a.1	Difusión y actualización de normas de la TCO y comunidades	4.755,04
a.1.1	Impresión de 30 ejemplares del Plan de Vida de la TCO Tacana I	0,00
a.1.2	Socialización y aprobación de estatuto de la TC	15.043,23
a.1.3	Diseño, diagramación e impresión de estatuto de la TCO	18.051,87
a.1.4	Actualización de reglamento de acceso y uso de recursos naturales de la TCO	0,00
a.2	Apoyo a los espacios de reflexión y análisis interno a través de reuniones de directorio, Asambleas, consultivas, CPILAP y CIDOB	32.686,01
a.2.1	Reunión de Directorio por comunidad	3.200,00
a.2.2	Reunión Mensual de Directorio	2.059,18
a.2.3	Reuniones Extraordinarias	1.500,95
a.2.4	Asamblea Consultiva CIPTA	5.839,42
a.2.5	Gestiones ante instancias orgánicas de deliberación (CPILAP y CIDOB)	5.763,69
a.2.6	Taller de capacitación en atención de covid y equipamiento por comunidad con botiquín de medicamentos	10.000,00
a.2.7	Gran Asamblea del CIMTA	4.322,77

PPI Aprobado 2021 por TACANA (CIPTA)		
a.2.8	Gestión para la titulación de saldo de demanda de tierra y territorio del CIPTA	0,00
a.3	Apoyo para gestiones ante el poder ejecutivo, municipios, gobernaciones, ONGs, otros)	12.560,16
a.3.1	Gestiones ante el poder ejecutivo, Gobernación, Municipios, ONGs	12.560,16
a.4	Diseño de un Fondo Fiduciario y Búsqueda de Financiamiento	14.000,00
a.4.1	Contratación y pago del Consultor	12.000,00
a.4.2	Gestión del Fondo Fiduciario	2.000,00
a.5	Elaboración final de proyectos de forma participativa en base al PGTI	7.000,00
a.5.1	Taller para la elaboración de proyecto entre el CIPTA y organizaciones de apoyo	0,00
a.5.2	Taller para elaboración de proyecto para comunidades de la TCO Tacana I a través del CIPTA y CIMTA.	7.000,00
	Unidad operativa del PPI	112.752,22
a.6.1	Servicio de Coordinador de Proyecto	16.200,00
a.6.2	Servicio de Administrador	13.800,00
a.6.3	Servicio de Chofer	9.000,00
a.6.4	Compra material de oficina	7.500,00
a.6.5	Compra combustible	4.000,00
a.6.6	Comunicación e internet	3.000,00
a.6.7	Servicio de mantenimiento de vehículo	2.500,00
a.6.8	Compra llantas	1.500,00
a.6.9	Viajes de seguimiento	3.480,35
a.6.10	Servicio de geodesta	0,00
a.6.11	Servicio de técnico forestal	15.240,00
a.6.12	Servicio de abogado	15.240,00
a.6.13	Secretaria Subcentral Ixiamas	6.051,87
a.6.14	Servicio Especialista Social	15.240,00
	Componente: Proyecto que promueva la cultura del pueblo Tacana I	495.203,07
	Nueva Infraestructura del CIPTA en Tumupasa (Diseño y Construcción) (****)	190.484,32
b.1.1	Diseño y calculo estructural	0,00
b.1.2	Infraestructura	178.571,43
b.1.3	Amurallado de perímetro de nueva oficina del CIPTA	11.912,89
b.2	Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de la nueva infraestructura del CIPTA en Tumupasa	45.656,07
b.2.1	Equipamiento de la oficina CIPTA - Ixiamas	0,00
b.2.2	Gastos de funcionamiento CIPTA - Ixiamas	2.000,00
b.2.3	Refacción y adecuación de oficina de Ixiamas	6.997,65
b.2.4	Cacetas y letreros informativos (oficinas, internado, centro cultural y plaza)	3.000,00
b.2.5	Construcción de muro Perimetral corregimiento del pueblo Tacana en Tumupasa	11.912,89
b.2.6	Equipamiento del corregimiento del pueblo Tacana en Ixiamas	5.000,00
b.2.7	Equipamiento de la oficina CIPTA - Tumupasa	0,00

PPI Aprobado 2021 por TACANA (CIPTA)		
b.2.8	TV 55' y equipo de sonido	1.600,00
b.2.9	Instalación de cámaras de vigilancia en nueva oficina	1.000,00
b.2.10	Adquisición de equipo para Radio Tacana	8.645,53
b.2.11	Mantenimiento y reparación de computadoras, impresoras y fotocopadoras	2.500,00
b.2.12	Gastos de funcionamiento CIPTA - Tumupasa (servicios básicos)	3.000,00
b.3	Traducción del libro de la cultura Tacana de Alemán-español	0,00
b.3.1	Consultoría para la traducción del libro Cultura Tacana	0,00
b.4	Impresión, publicación y difusión del libro de la cultura Tacana tanto en español como en Tacana	14.998,00
b.4.1	Impresión de ejemplares	14.998,00
b.5	Fortalecimiento del idioma Tacana a través de la gestión del instituto de lengua y cultura (ILC) Tacana.	26.135,26
b.5.1	Gestión del ILC	0,00
b.5.2	Equipamiento del ILC (Equipos e Instrumento Musicales)	6.000,00
b.5.3	Elaboración de planes y programas por año de escolaridad del curriculum regionalizado	3.000,00
b.5.4	Producción de Material Educativo	3.000,00
b.5.5	Impresión de materiales ILC.	14.135,26
b.5.6	Festival de promoción de la cultura Tacana	0,00
b.6	Apoyo a la formación profesional de jóvenes Tacanas a través de la construcción, equipamiento y funcionamiento de un internado en San Buenaventura	174.289,90
b.6.1	Contratación de servicios de arquitectura para el diseño del internado	0,00
b.6.2	Construcción de internado	153.352,73
b.6.3	Equipamiento del internado para 30 personas	20.937,17
b.6.4	Gastos de funcionamiento	0,00
b.7	Equipamiento inicial del museo para promover la cultura del pueblo Tacana en Tumupasa	7.000,00
	Compra de Artesanías - Tacana (para exhibición)	7.000,00
b.8	Implementación de un centro de producción de bordados con motivos culturales Tacana	43.639,52
b.8.1	Reparación y ampliación de taller de bordados	10.636,65
b.8.2	Instalación del centro de bordados (distribución e instalación de máquinas)	1.440,92
b.8.3	Adquisición de maquina bordadora	24.645,53
b.8.4	Reparación y mantenimiento de máquinas de costura (maquinas existentes)	2.881,84
b.8.5	Capacitación en el manejo de máquinas bordadora, costura y su mantenimiento y visita a centros exitosos	0,00
b.8.6	Adquisición de materiales de producción	4.034,58
C	Componente: Control territorial y monitoreo de impactos socioambientales.	42.112,37
c.1	Estrategia de control territorial	1.500,00
c.1.1	Elaboración de la estrategia y socialización por las comunidades	
c.2	Equipamiento para el control y vigilancia del territorio de la TCO	8.206,77
c.2.1	Adquisición de vehículo - camioneta	0,00

PPI Aprobado 2021 por TACANA (CIPTA)		
c.2.2	Brújula	0,00
c.2.3	GPS	0,00
c.2.4	Motor fuera de borda 40 HP	0,00
c.2.5	Adquisición de motocicleta	0,00
c.2.6	Drone	4.000,00
c.2.7	Motor peque peque de 16HP (1)	1.324,93
c.2.8	Lancha para peque peque (1)	2.881,84
c.3	Capacitación al equipo de control territorial y comunidades	0,00
c.3.1	Talleres de Capacitación en monitoreo y manejo de drone	0,00
c.4	Ejecución del control territorial a través de los guardas TCO	32.405,60
c.4.1	Equipamiento para control y monitoreo territorial	1.000,00
c.4.2	Alimentación para talleres capacitación	4.000,00
c.4.3	Guarda TCO 1	14.265,60
c.4.4	Guarda TCO 2	0,00
c.4.5	Adquisición de combustible	4.000,00
c.4.6	Mantenimiento de camioneta	2.500,00
c.4.7	Compra de neumáticos	640,00
c.4.8	Mantenimiento de motocicleta (4)	1.500,00
c.4.9	Compra de bote de madera (para deslizador)	4.500,00
c.5	Señalización de puntos estratégicos en la TCO	0,00
c.5.1	Señalización de la TCO Tacana I	0,00
	TOTAL	721.068,88

Presupuesto de personal.

- Expresar que en el **Presupuesto de Personal**, los montos identificados han sufrido variaciones producto que dichos ítems ha sido licitado por la ABC y por lo tanto la Supervisión Asociación Accidental CONNAL-DOHWA se ha adjudicado con montos menores; sin embargo, es importante resaltar que las diferencias son saldos positivos para ambos pueblos y por lo tanto podrán ser considerados a futuro, ya sea para incorporar en otros Componentes o caso contrario sirva dichos recursos para el pago de los profesionales, si hubiera una ampliación.

CAPITULO IV. ESTADO DE SITUACION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PPI TACANA

4.1. ESTADO DE SITUACIÓN.

Respecto a las **Obras de Infraestructuras**, estas han sido licitadas y existen dos empresas (Amazonía y LEVON) que se las han adjudicado las Obras de Infraestructura pertenecientes al Pueblo Tacana.

Cuadro N°7. Obras de Infraestructuras (licitación, adjudicación y PPI´s).

	Org. Indíg. Feder.	Infraestructura	Contratista	ABC	Propuesta y adjudicación por Contratistas (bolivianos) B	Org. Indígenas PPI 2021 (dólares) C	CONTRATO MODIFICATORIO (dólares)
				DDL Licitación (bolivianos) A			
1	Tacana	Construcciones Civiles De Las Instalaciones Del Cipta Ppi-3.1 En Tumupasa, No Incluye Equipamiento	LEVON	178.571,43	178.571,43	178.571,43	178.571,43
2	Tacana	Residencia Estudiantil	AMAZONIA	159.231,69	159.231,69	153.352,73	153.352,73

Elaboración propia sobre documentación oficial de ABC y PPI 2021 aprobado por Organizaciones Indígenas. (*)

Haciendo una evaluación de los DDL (ver columna A de Cuadro 3), las Propuestas de adjudicación de las Empresas Contratistas (ver columna B de Cuadro 3) y el presupuesto asignado por los PPI´s Tacana (ver columna C de Cuadro 3), lográndose sistematizarlos en el Cuadro 3: Infraestructuras (licitación, adjudicación y PPI´s) para una mayor y mejor comprensión, se realiza el análisis para determinar pautas para el Contrato Modificadorio:

- En primera instancia, las Propuestas de Adjudicación por parte de los Contratistas mantienen los montos en bolivianos de la licitación (DDL) y por lo tanto no se aproximan al Presupuesto de la ABC (columna B).
- En segunda instancia, los PPI´s aprobados del 2021 del Pueblo Indígena Tacanas, difieren en su presupuesto en dos de sus obras: a) Construcciones Civiles De Las Instalaciones Del Cipta Ppi-3.1 En Tumupasa, No Incluye Equipamiento y b) Residencia estudiantil; sin embargo, los presupuestos de ambas se constituyen en referentes para su construcción, por lo que deben ser considerados en última instancia al disponer de dicho monto económico.
- Así mismo, el PPI Tacana incorpora construcciones, ampliaciones y refacciones cuyas carpetas han sido elaboradas, y se ha sido definido que las Empresas Contratistas se harán cargo de su construcción. Las mismas corresponden a: b.1.3. Amurallado de perímetro de nueva oficina del CIPTA, b.2.3 Refacción y adecuación de oficina de Ixiamas, b.2.5 Construcción de muro perimetral corregimiento del Pueblo Tacana en Tumupasa y b.8.1 Reparación y ampliación de taller de bordados,
- Por último, hasta el presente y frente a la solicitud oficial por parte de la Supervisión, las directivas del Pueblo Tacana (CIPTA) no dispone de documentos legales de Propiedad en cuanto corresponde a Folios Reales, por lo que deberá

hacer las gestiones respectivas ante Derechos Reales para la obtención de su Derecho Propietario.

- Frente a todo lo señalado, concluimos que existen problemas técnicos-financieros y jurídicos-legales. Por lo expresado, se debe realizar una propuesta de Contrato Modificadorio por parte de Supervisión que deberá ser presentado a la ABC para su aprobación y posterior visto bueno por el Banco Mundial.

CAPITULO V. MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PPI TACANA

5.1. ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PPI

La ley N° 3507 de 27 de octubre del 2006, crea la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), como entidad encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental, constituida como una entidad de derecho público, autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía de gestión técnica, administrativa, económica y financiera.

Una vez suscrito el Convenio de Financiamiento entre el Gobierno de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del grupo de Banco Mundial y habiendo sido ratificado dicho instrumento por una ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Los Ministerios de Planificación y Desarrollo; Economía y Finanzas; Obras Publicas, Servicio y Vivienda, y la ABC suscriben un Convenio Subsidiario encomendando a la ABC la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Carretero San Buenaventura – Ixiamas.

5.1.1 Gerencia Regional La Paz - ABC

En el marco de lo descrito anteriormente, la ABC a través de la Gerencia Regional La Paz y Sub Gerencia Socio Ambiental será la responsable de fiscalizar a la Empresa de Supervisión la ejecución del PPI, como un programa dirigido a salvaguardar a los pueblos indígenas.

La ABC, a través de la Gerencia Administrativa Financiera y de la Gerencia Regional La Paz, participará en la inscripción y modificación del presupuesto de los fondos del PPI en el Ministerio de Hacienda, así como en la inscripción de recursos adicionales si fuera necesario, por tanto, es responsable de administrar los fondos del PPI.

La Gerencia Regional de La Paz, a través de sus Especialistas Social y Ambiental realizarán la Fiscalización y Monitoreo a la implementación del PPI de forma directa.

La Gerencia Regional La Paz y la Gerencia Administrativa Financiera, aprueban el Manual Operativo del PPI, previa no objeción del Banco, además es la encargada de revisar y aprobar el POA, Presupuesto y Plan de Adquisiciones anualmente, previa no objeción del Banco Mundial.

5.1.2 Empresa de Supervisión

La Empresa de Supervisión en el marco del Apéndice A: Términos de Referencia, y en concomitancia con su equipo de Supervisión Ambiental y Social conjuntamente con el equipo técnico del PPI será la responsable de la ejecución del Plan de Pueblos Indígenas Tacana y el Plan de Pueblos Indígenas Ese Ejja. En el marco de lo señalado la Empresa de Supervisión implementara los PPI´s Tacana y Ese Ejja, garantizando el cumplimiento de la norma ambiental y de las políticas O.P. 4.10 Pueblos Indígenas del Banco Mundial, cuyo objetivo es evitar, minimizar, controlar y/o mitigar los impactos potenciales asociados a la construcción de los puentes.

Por lo señalado y en el marco de lo establecido en los TdR, la Empresa Supervisora coordinará la operativización con la Gerencia Regional ABC La Paz y la Subgerencia Socio Ambiental de la ABC.

5.1.3 Equipo técnico del PPI

En el marco del Apéndice A: Términos de Referencia Proyecto: Supervisión de la Construcción de Puentes CARRETERA SAN BUENAVENTURA-IXIAMAS se ha licitado y delegado la Supervisión la contratación de un equipo multidisciplinario (1 año) para la implementación de los PPI Tacana y Ese Ejja compuesto por el siguiente personal:

Cuadro N°8 Personal técnico del PPI Tacana

Cargo	Nombre	PPI
Coordinador de PPIs	José Luis Alvarez	PPI Tacana y Ese Ejja
Administrador	John Berrocal	PPI Tacana y Ese Ejja
Técnico forestal	Nicolas Fessy	PPI Tacana
Apoyo Social	David Beyuma	PPI Tacana
Abogado (*)		PPI Tacana
Fiduciario	Wilmar Janco	PPI Tacana
Secretaria de Ixiamas (*)		PPI Tacana
Chofer	José Rafael Chávez	PPI Tacana

(*) Profesionales aun no contratados

Elaboración propia

5.1.4 Funciones y responsabilidades del Equipo Técnico del PPI

El Equipo Técnico del PPI, como un equipo de trabajo de campo tiene las siguientes funciones:

- Coordinar con los Representantes del Consejo Indígena del Pueblo Tacana CIPTA, para establecer acuerdos y aprobación de la implementación de los componentes del PPI, POA, Presupuesto y PAC.
- Informar periódicamente a los Representantes de CIPTA, sobre temas referidos a la implementación del PPI y del proyecto carretero San Buenaventura-Ixiamas.
- Elaborar y/o actualizar el Plan de Operaciones Anual (POA), Presupuesto Anual y Plan Anual de Contrataciones (PAC) de los PPIs, en el marco del Convenio de Financiamiento No. 4923-BO.
- Hacer seguimiento a la implementación de obras civiles correspondientes al PPI Tacana, PPI Ese Ejja y FESPAI.
- Solicitar adquisiciones y elaborar Especificaciones Técnicas y los Términos de Referencia para los procesos de contrataciones o adquisiciones.
- Administrar y realizar el seguimiento a: adquisición de bienes y resultados de consultoría, cuidando y asegurando la calidad de estos.
- Remitir informes periódicos técnicos y administrativos a la oficina Regional de la ABC La Paz,
- Solicitar fondos de avance y presentar informes de descargos debidamente documentados.
- Realizar acciones de Recepción, registro y custodio los activos adquiridos en la implementación del PPI de acuerdo a la normativa de la ABC.
- Facilitar las tareas de la realización de auditorías.
- Realizar seguimiento de los resultados logrados de los componentes y actividades implementadas del PPI.

5.1.5 Consejo Indígena del Pueblo Tacana CIPTA

- El CIPTA, en representación del pueblo Indígena Tacana, se responsabiliza en la identificación, priorización y aprobación de las actividades descrita en el PPI para su implementación y además de la gestión sostenible de bienes adquiridos como de los proyectos implementados, como beneficiarios directos del proyecto vial.

- Los representantes del CIPTA, definen, priorizan y aprueban para su inscripción en el POA, presupuesto y PAC, en el marco del presupuesto definido en Convenio Interinstitucional y del PPI. Así mismo realizan el control en la ejecución de las actividades del PPI.
- También entre sus atribuciones está la de coordinar el buen desarrollo y ejecución del PPI, en el marco de las salvaguardas sociales y ambientales del ente financiador, Banco Mundial. Así mismo solicitar información cuando así lo requieran.
- En reunión realizada el 18 de julio de 2019 CIPTA realiza una evaluación del avance de la implementación del PPI estableciendo la necesidad de ajustar los procedimientos, sistematización y reporte de resultados alcanzados y la reactivación del PPI después de un periodo de paralización.

5.1.6 Empresa Contratista

- La Empresa Contratista que ejecutará el Proyecto carretero San Buenaventura – Ixiamas es responsable de construir las infraestructuras previstas en el PPI según las Especificaciones técnicas establecidas en los documentos de Licitación de Obra, debiendo priorizar la ejecución de las infraestructuras al inicio del proyecto carretero.

CAPITULO VI. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CIERRE DE LA IMPLEMENTACION DEL PPI

6.1 MODALIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PPI

En el marco de políticas de salvaguardas socio ambientales del Banco Mundial, del proyecto de mejoramiento carretero San Buenaventura – Ixiamas, definidos en el Convenio de Crédito N° 4923-BO el seguimiento y la evaluación tiene como objetivo de llegar a los resultados, optimizar recursos y cumplir con los actividades y resultados definidos en el PPI.

6.1.1. Seguimiento a implementación del PPI

El seguimiento a la ejecución física y financiera del PPI estará bajo la responsabilidad del equipo de especialistas del proyecto. El PPI define los siguientes niveles para el seguimiento de sus actividades y resultados:

- a) Nivel de Beneficiario, se refiere a las actividades de seguimiento y control realizado por los beneficiarios, por medio del CIPTA en las actividades de ejecución del PPI. Las actividades y conclusiones de este nivel de seguimiento deberán ser insertados en los respectivos libros de Actas de las comunidades. Información (copia del documento) a ser proporcionada a las instancias correspondientes de la ABC.
- b) Nivel de Ejecución, la Supervisora como entidad responsable de administración del fondo del PPI, efectuará la ejecución de las actividades en cada uno de los componentes y subcomponentes del PPI; para este fin, la responsable de reporte de información de ejecución de actividades de campo serán los Técnicos del PPI.
- c) Nivel de Fiscalización, la ABC como entidad responsable de los recursos financieros, efectuará el seguimiento a las actividades en cada uno de los componentes y subcomponentes del PPI; para este fin se dispondrá de la Responsable Social de la ABC quien emitirá informes mensuales institucionales hacia el Banco Mundial.
- d) Nivel Organismo Financiador, el Banco Mundial, realizará seguimiento a través informes (mensuales y anuales de avance de resultados, auditorías anuales de adquisiciones y financieras remitidas de ABC a BM).

El seguimiento a los resultados, por parte del Banco Mundial, se efectúa con fin de dar cumplimiento a las salvaguardas socio ambientales y realizar las medidas correctivas o ajustes correspondientes en acuerdo entre ABC y BM.

6.1.2. Evaluación del PPI

La evaluación de la implementación del PPI, se realizará de acuerdo a los resultados de componentes descritos en el presente PPI Tacana.

Las Entidades indicadas a realizar esta actividad son: la ABC y el CIPTA en común acuerdo y de manera conjunta, la misma que se desarrollará de forma semestral tomando en cuenta el avance físico y financiero. Las recomendaciones de los resultados de la evaluación serán de estricto cumplimiento tanto para ABC como para los beneficiarios CIPTA, a fin de cumplir con el objetivo de la evaluación.

La evaluación de desempeño del Equipo Técnico PPI, tiene como objetivo verificar la eficiencia y eficacia de la administración y ejecución de la implementación del PPI, tomando en cuenta los procesos administrativos internos de la ABC (Manual de Organización y Funciones de la ABC (Resolución del Directorio ABC/DIR/010/2012), como lo establece el Manual de Operaciones del PPI. Las Entidades a realizar dicha actividad son: la ABC y el CIPTA.

6.2. MEDIDAS DE CORRECCION.

Los reportes generados por el Sistema de Seguimiento Físico y Financiero de la implementación del PPI contribuirán a la generación de medidas correctivas, de acuerdo con los factores que incidieron en la ejecución de las actividades.

Las medidas correctivas podrán ser propuestas por la ABC, la Supervisión y/o los beneficiarios, en función de las prioridades del PPI y será procesada y tendrá el visto bueno de la ABC, quien solicitará la conformidad al Banco Mundial para su implementación cuando corresponda.

6.3 CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI.

La implementación del PPI está definido por componentes. La primera, Fortalecimiento organizativo del CIPTA, está relacionada con la implementación de las inversiones -establecidos en componentes- en el plan del PPI en cumplimiento de las Políticas Operacionales OP 4.10 y BP 4.10 del Banco Mundial; políticas elaboradas con la misión de coadyuvar y salvaguardar los derechos de los Pueblos Indígenas en el proceso de ejecución del proyecto de mejoramiento carretero de San Buenaventura – Ixiamas.

El cumplimiento de la implementación del PPI, se da cuando se concluye todos los componentes y actividades de los PPI en términos administrativos y técnicos.

Para ello como constancia y cierre se suscribe el Acta de cumplimiento de inversiones y transferencia de activos entre ABC y los representantes CIPTA; como parte del cumplimiento de salvaguardas a los pueblos Indígenas, en compensación socio ambiental del proyecto

6.4 SISTEMA OPORTUNO DE ATENCION DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS.

La Empresa de Supervisión implementó un mecanismo de consultas, quejas y reclamos de la población local en centros urbanos del área de implementación del PPI: San Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas. Además de ello, se ha instruido y se han instalado los mecanismos en cada una de las oficinas y/o campamentos de las Empresas Contratistas, teniendo además buzones para la recepción de consultas y reclamos de la población.

Objetivo General

Implementar un Sistema de Atención y Resolución de Conflictos, para el manejo de los reclamos de los actores sociales, y políticos involucrados en la "Construcción de la Carretera San Buenaventura- Ixiamas"

Objetivos Específicos

- Definir las actividades que hacen parte de un proceso de atención de reclamos.
- Delimitar el Flujograma de atención, gestión y resolución de Conflictos.
- Proponer una matriz de identificación de actores claves.
- Definir los tiempos para atención a las Quejas y Reclamos.
- Proponer una herramienta de recolección de consultas y reclamos
- Presentar matriz sistematización de seguimientos a las consultas y reclamos

Proceso de Atención, Gestión y Resolución de Conflictos

Los niveles de intervención a la Atención, Gestión y/o Resolución de una consulta, queja, reclamo, dependerá de su alcance y/o complicación, siendo la Empresa de Supervisión y el Equipo Técnico del PPI responsables de implementar este mecanismo durante la ejecución del Proyecto. En caso de que la queja no pueda ser atendida por esta instancia o la competencia institucional de ABC no pueda cubrir su resolución,

se prestara asesoramiento y acompañamiento para remitir a las instancias judiciales competentes.

Las quejas recibidas podrán ser orales y escritas y eventualmente anónimas si es que el reclamante así lo prefiere.

Proceso de información a usuarios sobre la implementación del Mecanismo de Atención a Consultas, Quejas y Reclamos y su difusión por medios

En el marco de la implementación del Mecanismos de Consultas, Quejas y Reclamos, se ha elaborado una estrategia de información dirigida a la población del área de influencia del proyecto: comunidades, instituciones, organizaciones sociales y población indígena en particular.

Esta estrategia comprende el uso de medios masivos como radios locales, la ejecución de reuniones informativas, visitas a instituciones y organizaciones con participación de autoridades y dirigentes y vía WhatsApp con la finalidad de difundir los instrumentos propuestos, tanto para la formulación de la queja y/o reclamo, la recepción y registro, posteriormente la derivación a instancias componentes y el cumplimiento de los plazos previstos. Por lo señalado se ha elaborado instrumentos y herramientas para la recepción, registro e información de las consultas, quejas y reclamos y actualmente se están aplicando en los cuatro lotes y la supervisión. Complementando lo anterior, la Supervisión ha incorporado una línea telefónica (76719372) para recepcionar consultas, quejas y reclamos vía WhatsApp, además de un correo electrónico sbi@connalsrl.com.

Este proceso que ya dio inicio ha permitido que ya se recepciones reclamos provenientes de la población, muchos de los cuales ha fueron resueltos.

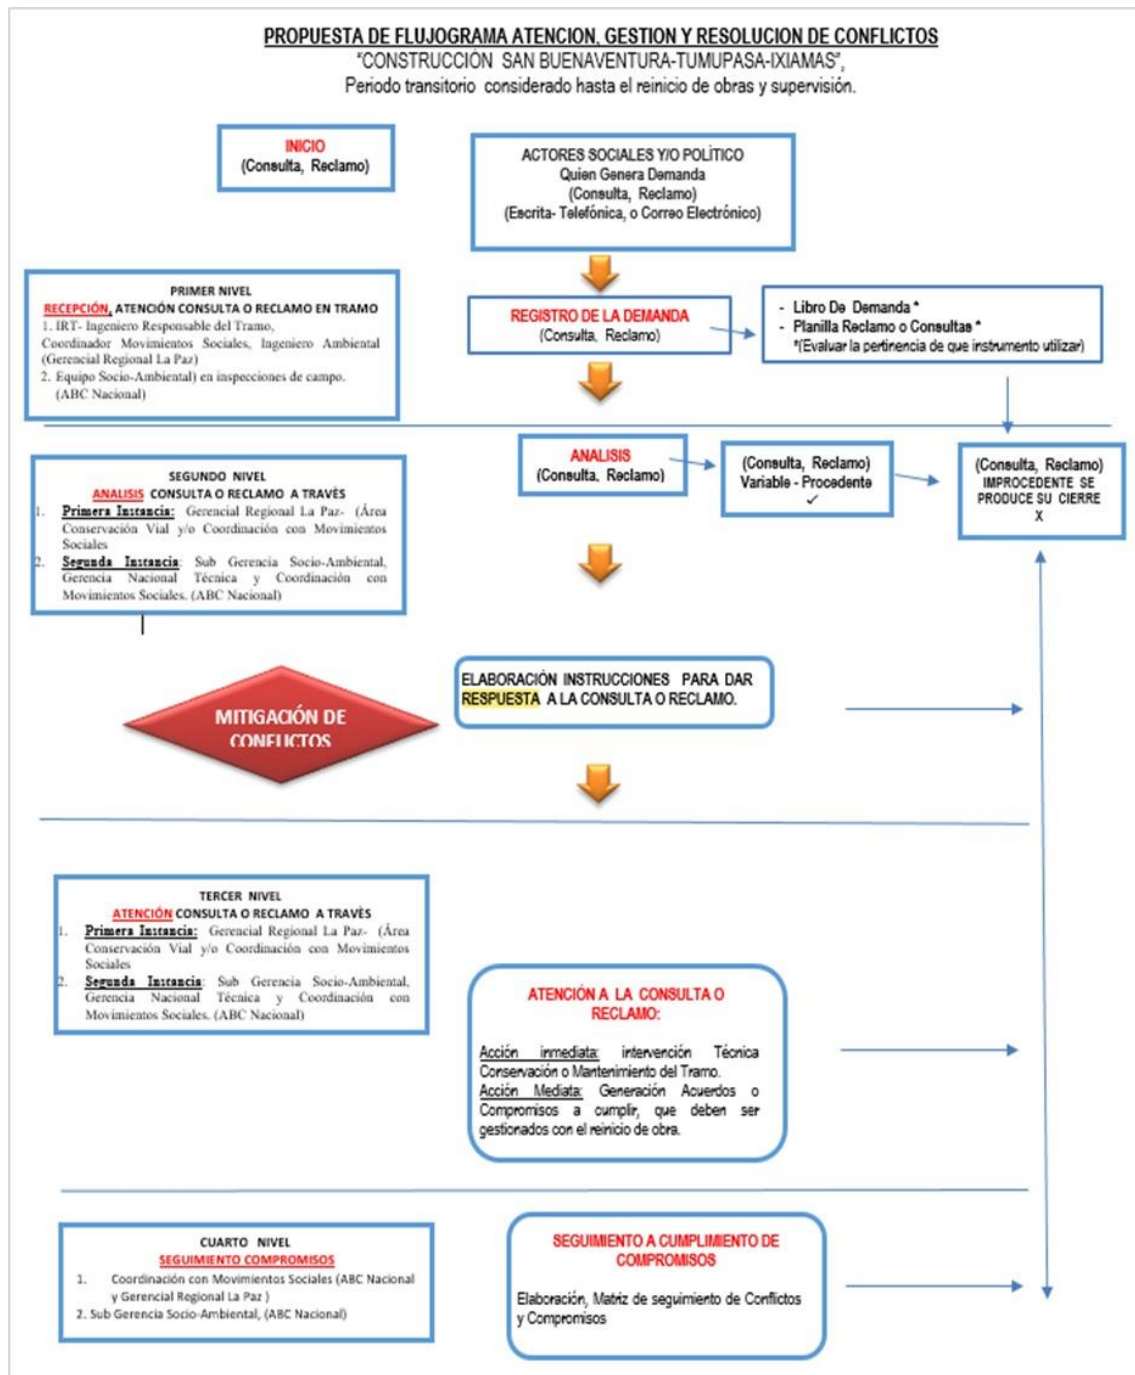
En lo que corresponde al pueblo indígena Tacana, la Supervisión implementará un mecanismo de consultas, quejas y reclamos en el CIPTA y CEE que consiste brindar información sobre los objetivos y los procedimientos y la colocación de un buzón.

Costos de Funcionamiento del Mecanismo de Atención a Consultas, Quejas y Reclamos

La atención a los Mecanismo de Consulta, Quejas y Reclamos, en lo físico y utilizando las nuevas tecnologías correrá a cargo de la Supervisión en términos financieros y operativos y en lo que corresponde a las Empresas Contratistas de igual modo por dichas instancias.

ANEXOS

FLUJOGRAMA DE ATENCION, GESTION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS



FORMULARIO DE REGISTRO DE QUEJAS, CONSULTAS Y RECLAMOS

PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO (PRP)				N.:	
REGISTRO DE QUEJAS, CONSULTAS Y RECLAMOS					
A. DATOS DEL INTERESADO O INTERESADA					
Nombre/Apellido :					
Edad:		Sexo:			
N° de CI.		N° Cel de Ref.:			
Comunidad		Municipio			
Ref. Lote/Puente	/ /	Fecha			
B. DETALLE U OBJETO DE LA QUEJA/CONSULTA O RECLAMO					
C. CATEGORIA					
Queja		Reclamo		Consulta	
D. CORRESPONDE A LA INSTANCIA DE:					
Contratista		Supervision		ABC	
E. CORRESPONDE AL AREA:					
Técnica		Social		Ambiental	
F. INSPECCION/RESPUESTA/ACUERDO (FECHA LIMITE)					
Firma, nombre y apellidos de interesado o interesada					
Nombre y Apellido del personal que recibe la Q.C.R.				Firma	

MATRIZ DE SISTEMATIZACION DE QUEJAS, CONSULTAS Y RECLAMOS

REGISTRO DE QUEJAS, CONSULTAS Y RECLAMOS																	
ITEM	CÓDIGO	DATOS GENERALES							ÁREA	CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	CORRESPONDE RESOLVER A:		ESTATUS A LA FECHA	CIERRE DE ATENCIÓN DE RECLAMO/QUEJAS		
N°	L1A - L1B L2A - L2B SP - ABC	Fecha	Nombre del interesado/a	Edad	Sex	C.I	Comunidad o municipio	Telf. De Ref.	Técnica Social Ambiental Otros	Consulta Queja Reclamo	Consulta Queja Reclamo	Contratista Supervisión ABC DNA-SLIN Otros	Fecha de derivación	En proceso Resuelto	Fecha	Acuerdos Alcanzados	Responsable
5																	
6																	

Carmen del Emero

San Antonio del Tequeje

Villa Fátima

Cachichira

Copacabana

Tres Hermanos

amarani

Villa Alcira

San Miguel

Buena Vista

Bella Altura

Capaina

Tumupasa

San Silvestre

Santa Rosa de Maravillas

Nueva Esperanza

Macahua

Carmen Pecha

Santa Fe

San Pedro



CIPTA

CONSEJO INDÍGENA DEL PUEBLO TACANA

Nº 0837

Tumupasa, 23 de abril de 2021

0002485


Señor:

Ing. Rolando Pérez Lavayen

SUB GERENTE SOCIO AMBIENTAL

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

La Paz.-



REFERENCIA.: COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PUEBLO INDÍGENA TACANA - PROYECTO CARRETERO SAN BUENAVENTURA - IXIAMAS.

Señor Gerente:

En el marco de la coordinación interinstitucional entre la Administradora Boliviana de Carreteras con el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), se ha coordinado con los técnicos de su Sub Gerencia a efecto de dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Pueblo Indígena Tacana y Esse Ejja del proyecto carretero San Buenaventura - Ixiamas.

En este sentido, solicitamos por intermedio de la presente se constituya una comisión en la población de Tumupasa el día viernes 07 de mayo a horas 09:00 en oficinas de nuestra organización a efecto de atender los siguientes puntos:

- Estado actual de la ejecución presupuestaria del componente PPI Tacana - Esse Ejja.
- Socialización de los Planos de la Infraestructura del CIPTA.
- Planificación para la ejecución de los componentes A, B y C.

Sin otro particular saludamos a usted con las mayores atenciones.

Sergio Quenevo Cartajena
Presidente CIPTA

Dani Mamio Serato
Secretario de Recursos Naturales
CIPTA

Cc. Archivo

Tumupasa - Provincia Abel Iturralde

☎ 591-71149949 / 591-67367195 // ✉ cipta-org@hotmail.com



2049

La Paz, 05 MAY 2021
ABC/GNT/SSA/2021-0120

Señor
Sergio Saúl Quenevo Cartagena
Teléfono Móvil: 67367195
PRESIDENTE
CONSEJO INDÍGENA PUEBLO TACANA
Presente. -



REF.: RESPUESTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PLAN DE PUEBLO INDÍGENA TACANA - PROYECTO CARRETERO SAN BUENAVENTURA - IXIAMAS.

Señor Presidente:

Cursa en mi despacho, su atenta nota mediante la cual y en el marco de la Coordinación Interinstitucional entre la Administradora Boliviana de Carreteras y el Pueblo Tacana (CIPTA), solicita al presente despacho la socialización de los planos de la Infraestructura del CIPTA, el estado actual del componente del Plan de Pueblos Indígenas del proyecto de referencia, así como la planificación de los componentes A, B y C del mismo.

Al respecto, mediante la presente nota, comunico a su Autoridad, que personal de la Subgerencia Socio Ambiental de la Gerencia Nacional Técnica, de la Administradora Boliviana de Carreteras, se hará presente en Tumupasa, el día viernes 07 de Mayo de 2021, a horas 09:00 para socializar la información solicitada.

Sin otro particular, reitero a usted mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

Ing. Rolando Pérez Lavayen
SUB GERENTE SOCIO AMBIENTAL
Administradora Boliviana de Carreteras

2021-02485

NB/ISO
9001

IGNORCA

OFICINA CENTRAL (La Paz): Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, piso N° 8, Teléfono: (2) 2159800 | REGIONAL LA PAZ Dirección: Av. 20 de Octubre N° 1029 y Landarte, Teléfonos: (2) 2154164 - 2495043, Fax: 2494544 | REGIONAL SANTA CRUZ Dirección: Av. Itoca y Coronado N° 950 entre 3er. y 4to. Anillo frente Hotel Bugavillas, Teléfonos: (3) 3547031 - 3123884, Fax: 3579157 | REGIONAL COCHABAMBA Dirección: Av. Villazón Km. 1 1/2 N° 2345 Edificio SNC 3er. Piso, Teléfonos: (4) 4492264 - 4492265 - 4492266 | REGIONAL ORURO Dirección: Av. Sargento Flores N° 5 esquina prolongación Velasco Galvarro, Teléfonos: (2) 5282677, Fax: (2) 5113562 | REGIONAL TARIJA Dirección: Av. Julio Arce esq. Manuel Álvarez Barrio SENAC, Zona Tabladita, Teléfonos: (4) 6661459 Fax: (4) 6647918 | REGIONAL CHUCUISACA Dirección: Calle Ursulino N° 49 Zona Central, Teléfonos: (4) 6437942 Fax: 6455407 | REGIONAL POTOSÍ Dirección: Calle Wenceslao Alba, Pasaje Superior s/n Teléfonos: (2) 6230171, Fax: 6122856 | REGIONAL BENI Dirección: Calle Lázaro de Rivera esq. Batelón N° 190, Teléfonos: (3) 4621677 - 4628923 Fax: 4620918 | REGIONAL PANDO Dirección: Av. Cívica N° 42 Barrio Miraflores, Teléfonos: Tel/Fax (3) 8423560 - 8423685.

Carmen del Emero

San Antonio del Tequeje

Villa Fátima

Cachichira

Copacabana

Tres Hermanos

Altamarani

Villa Alcira

San Miguel

Buena Vista

Bella Altura

Capaina

Tumupasa

San Silvestre

Santa Rosa de Maravillas

Nueva Esperanza

Macahua

Carmen Pecha

Santa Fe

San Pedro



CIPTA

CONSEJO INDÍGENA DEL PUEBLO TACANA

Nº 1224

Tumupasa, 30 de junio de 2021
CITE: SOL/OF/CIPTA/Nº0166/2021

Señor
Cristian Rodriguez
Especialista Socioambiental
Administradora Boliviana de Carreteras
Presente. -

REF.- Presentación de PPI Tacana I, ajustado
para la gestión 20-21.

De nuestra mayor consideración:


Reciba un cordial saludo del Directorio de la TCO Tacana I, después de un arduo trabajo del directorio y algunos representantes de comunidades, concluimos el ajuste del PPI Tacana, en base a los datos ejecutados y saldos, proporcionados por la ABC.

Asimismo, el PPI ajustado fue enviado y socializado con usted, después de hacer los ajustes a sus recomendaciones, hacemos llegar a su persona como representante de la ABC el PPI ajustado para su ejecución en la gestión 20-21.

También indicamos a su persona que estos documentos serán enviados vía email y copia al Banco Mundial.

Esperando respuestas positivas y pronto continuar con este proceso, nos despedimos.

Atte



Tumupasa - Provincia Abel Iturralde

☎ 591-71149949 / 591-67367195 // ✉ cipta-org@hotmail.com

Acta de Reunión entre Cipta y, ABC.

En oficinas del Consejo indígena del pueblo
Tacana Cipta cuando horas 9:00 del
día Viernes 7 de mayo del año
2021 se llevo adelante una reunión
en coordinación con la ABC. repre-
sentado por el Sr. Carlos Torato Viro
Coordinador del Programa de Reposición
de perdidas de la ABC.
Como le palabra al Sr. Sergio Guerrero
presidente Cipta dando la Bienvenida
al representante de la ABC.
Para conocer el estado de ejecución
de los Componentes A-B-C.
Como le palabra al Coordinador de
la ABC haciendo conocer y compro-
miso de trabajo en conjunto
con dirección con la institución
y también proporcionar información sobre
largo si pasa a la ejecución de los
programas ejecutados, dando a entender
que las obras del pueblo Tacana
empesaron paralelo a la construcción
de los puentes. Comenzando la construc-
ción de los obras en un plazo de
7 meses.
También obto sobre la impresión del libro
Tacana que está se está resolviendo.
en un plazo de 2 meses a partir de
la fecha. También se obto sobre el tema
de los guardas fco que será una
coordinación inmediata la cual
queda a consideración de la ABC.
Para que se ejecute paralelo a la
construcción de la obra construcciones

Tengo se pasó a la exposición de los
Coms Funcionarios de cara a que del
CPTA donde fue presentado los
planes. Luego pasó al plenario de
la Com Función del Intermado. acuerdo
conocer que al intermado su apreciación
está en cero (0) y que al agurpante
se orio los dos últimos meses de
Coms Funcionarios.

También se ablo sobre el Componente 5. quien
sino es parizable de su apreciación al centro.
en el plan de producción de Violencia y Género
También se ablo sobre la apreciación
de presupuesto de lo Ejecutado y lo
que falta ejecutar donde no se
dio ninguna explicación quedando un
acuerdo de partes. una proxima reunión
para exponer los numéros Ejecutados hasta
el 26- de mayo del presente año
as con lo que formio la reunión con
el compromiso de transmitir los preocupa-
ciones del pueblo tacana que en caso
no iniciaran las obras al finabes de julio
el pueblo tacana saldara a los colles
en huelga indefinida. es as lo que
formio la reunión. a hora, 11:30 del
mismo día

WZ Thome Terrazas C.
SECRETARÍA DE SALUD Y CULTURA
CIPTA

WZ Carlos H. Landa Vind
PRESIDENTE
CIPTA


E. Kemei Fessy G.
VICE PRESIDENTE
CIPTA

WZ Carlos H. Landa Vind
COORDINADOR PRO
CMT/SSA - AQ-

T. Jose Beyuma C.
SECRETARÍA DE TIERRA Y TERRITORIO Y AUTONOMÍA
CIPTA

E. Nazaret Merupe B.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SALUD Y CULTURA
CIPTA

Imapet



Sergio Sant Quenemo G.
DIRE. CONSEJO INDIGENA
DEL PUEBLO TACANA
CIPTA

WZ Carlos H. Landa Vind
TEC. MONITOR
CIPTA

Dario Mamio Seralo
STRO. RECURSOS NATURALES
INVESTIGACIÓN Y TURISMO
CIPTA

Quemier

Carmen del Emoro

San Antonio del Tequeje

Villa Fátima

Cachichira

Copacabana

Tres Hermanos

amarani

Villa Alcira

San Miguel

Buena Vista

Bella Altura

Capaina

Tumupasa

San Silvestre

Santa Rosa de Maravillas

Nueva Esperanza

Macahua

Carmen Pecha

Santa Fe

San Pedro



CIPTA

CONSEJO INDÍGENA DEL PUEBLO TACANA

Nº 00837

Tumupasa, 23 de abril de 2021

0002485

Señor:

Ing. Rolando Pérez Lavayen

SUB GERENTE SOCIO AMBIENTAL

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

La Paz.-



REFERENCIA.: COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PUEBLO INDÍGENA TACANA – PROYECTO CARRETERO SAN BUENAVENTURA – IXIAMAS.

Señor Gerente:

En el marco de la coordinación interinstitucional entre la Administradora Boliviana de Carreteras con el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), se ha coordinado con los técnicos de su Sub Gerencia a efecto de dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Pueblo Indígena Tacana y Esse Eja del proyecto carretero San Buenaventura – Ixiamas.

En este sentido, solicitamos por intermedio de la presente se constituya una comisión en la población de Tumupasa el día viernes 07 de mayo a horas 09:00 en oficinas de nuestra organización a efecto de atender los siguientes puntos:

- Estado actual de la ejecución presupuestaria del componente PPI Tacana – Esse Eja.
- Socialización de los Planos de la Infraestructura del CIPTA.
- Planificación para la ejecución de los componentes A, B y C.

Sin otro particular saludamos a usted con las mayores atenciones.



Sergio Quenevo Cartajena
Presidente CIPTA

Darío Mamio Serato
Secretario de Recursos Naturales
CIPTA

Cc. Archivo

Tumupasa - Provincia Abel Iturralde

☎ 591-71149949 / 591-67367195 // ✉ cipta-org@hotmail.com





Acto de Reunión


Entre la ABC - Cipta - Cima
y el Sector Ixcamos.


En oficinas del Consejo Indígena del pueblo Ixcamos
Cipta siendo horas 10:00 AM del día martes
3 de agosto del año 2021. Se reunieron
una reunión entre los miembros de la ABC.
Sr Cristian Rodríguez Especialista Social ABC. y el
ing Eliseo Rocha jefe de fiscalización ABC.
miembros de DONCONAH - Empresa de fiscalización
y el Directorio Cipta con el único punto
a tratar aprobación del PPI en todos sus componentes
comenzó la reunión con palabras de bienvenida
por parte del presidente del Cipta
Luego se pasó a revisar el PPI con algunas
observaciones. en cuanto a. amovilidad propuesta
de la nueva infraestructura. en lo cual estuvo el directorio
de la Ejecución.
también hubo observaciones sobre el fondo fiduciario
en la cual se aclaró y se explicó y fue útil para
el Cipta.
también se habló sobre relación de la sub comisión
relación ampliación presupuesto
relación ampliación con la misma
lo cual este sub componente facilonen la
Ejecución. y si riesgo de No Ejecutar
pero se cambiaria el item.
también se habló sobre la adquisición de equipos de
Radio en la que se coincidió en la compra de
Nuevos Equipos
Se habló sobre la impresión del libro Ixcamos
en lo cual solo falta la presentación y se entregó.
- Se habló sobre el instituto de lengua Ixc.
también se cambió de gestión o Equipamiento.


tambien se ablo sobre la implementacion de profesores
tacanas en lo cual se analizo cual seria el
trabajo y la contratación de maestros o blancos
- lo cual se decidió en que no va como contratación
sino como elaboración de materiales de capacitación
Se hablo sobre la construcción del mejorado
Sistema - en la cual que ha como es lo
diseñado y presupuesto.
tambien hubo observacion en el tema de
delimitación de la tco - en lo que se queda
en socialización del territorio tacana.
en resúmenes - todo el componente A - a sido
modificado y aprobado.
el componente B. B1-3 B-24 - B2-56
Segun Concursando con supervisión y alternancia
en el punto C- fue aprobado en
su totalidad.
quedando en plazos establecidos a la
brevedad posible en la primera semana
de agosto - para solucionar algunas observaciones
y empezar con la ejecución por la empresa
Supervisora



106 Eliseo Rodia
ARL Regional La Paz



Sergio Vazquez
ABC-CEP



E. Komei Fassy G.
VICE PRESIDENTE
CIPTA


E. Naranjo
CIPTA


Sergio Saul Quintero C.
FOTE CONSEJO INDIGENA
DEL PUEBLO TACANA
CIPTA



Hiram Uzgum



Pascual Beyuma Chugui
CORREGIDOR
TERRITORIAL AMAZONICO-IXIAMAS


Fulvia Medina C.
Vicepresidente
Consejo Indígena de Mujeres Tacanas
CIPTA


CONSEJO INDIGENA DE MUJERES TACANAS
CIPTA
PROV. ITURRALDE
LA PAZ


CONSEJO INDIGENA DE MUJERES TACANAS
CIPTA


Yhormy Pablo Colque
PRESIDENTE


Lic. Christian Rodriguez

BIBLIOGRAFIA

ABC, 2016. Manual de Operaciones de los Planes de Pueblos Indígenas

ABC 2011. Estudio de Evaluación Social y Elaboración de un Plan para los Pueblos Indígenas de la Zona del Proyecto "Ixiamas - San Buenaventura" Plan de Pueblos Indígenas

ABC, 2016. Estrategia de Control y Monitoreo Territorial de la TCO Tacana I

Administradora Boliviana de Carreteras (2020) "Protocolo de Bioseguridad para el Desarrollo de Actividades en Instalaciones de las Gerencias Regionales". La Paz.

Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y Wildlife Conservation Society (WCS (2013) Escenarios de deforestación en el Gran Paisaje Madidi-Tambopata

Iniciativa Ecuatorial (2016) serie de estudios de caso de la iniciativa ecuatorial del PNUD.

Chiovoloni, Moreno, 1996 Caracterización y evaluación de las estrategias de manejo de recursos naturales del pueblo Tacana, La Paz, PNUD/SAE.

Diez Astete, A.; Murillo, D., 1998 Pueblos indígenas de tierras bajas: características principales, La Paz, Bolivia.

Lehm, Z. 2019. Wildlife Conservation Society: 20 años de trabajo con pueblos indígenas y comunidades locales para la conservación de la vida silvestre en la Amazonía Andina

Lehm Z 2016 Sistematización de la Historia del Gobierno en la Región TACANA Wildlife Conservation Society (WCS) y Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA). La Paz, Bolivia.

Lemh Z 2017. Ingresos Económicos en Hogares de la TCO TACANA I

Wentzel, Sondra. 1989. Tacana and Highland Migrant land Use, Living Conditions, and local organization in the Bolivian Amazon. La Paz, Bolivia, Universidad de Florida, Gainesville, Estados Unidos

World Bank " Technical Note: Public Consultations and Stakeholder Engagement in WB-supported operations when there are constraints on conducting public meetings. Washintong – USA. March 20, 2020.
